
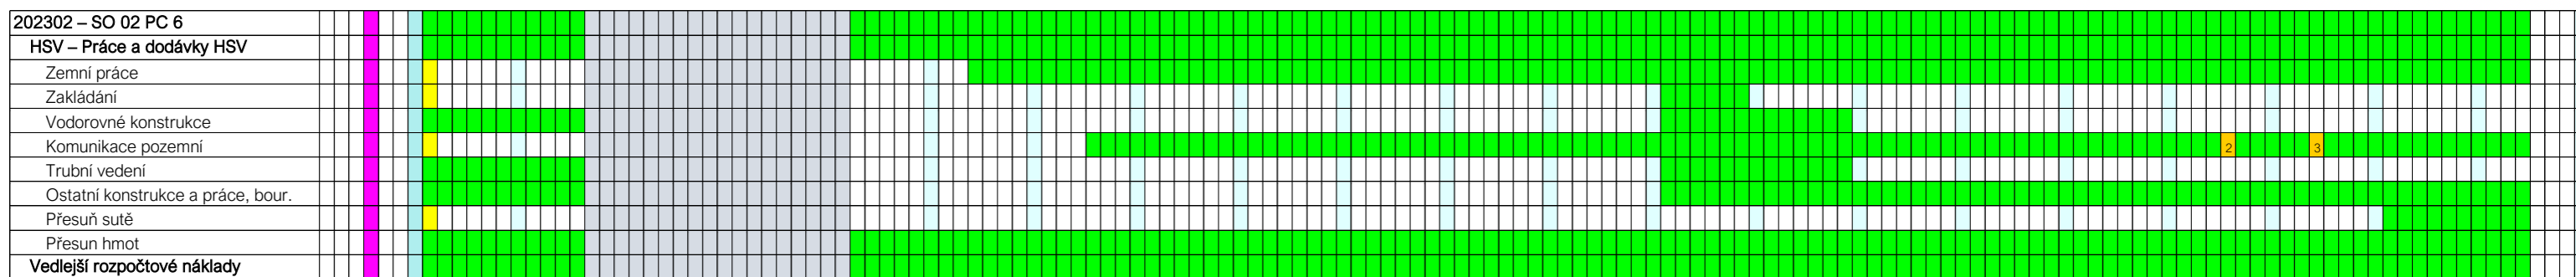


HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ – POLNÍ CESTY TCHOŘOVICE

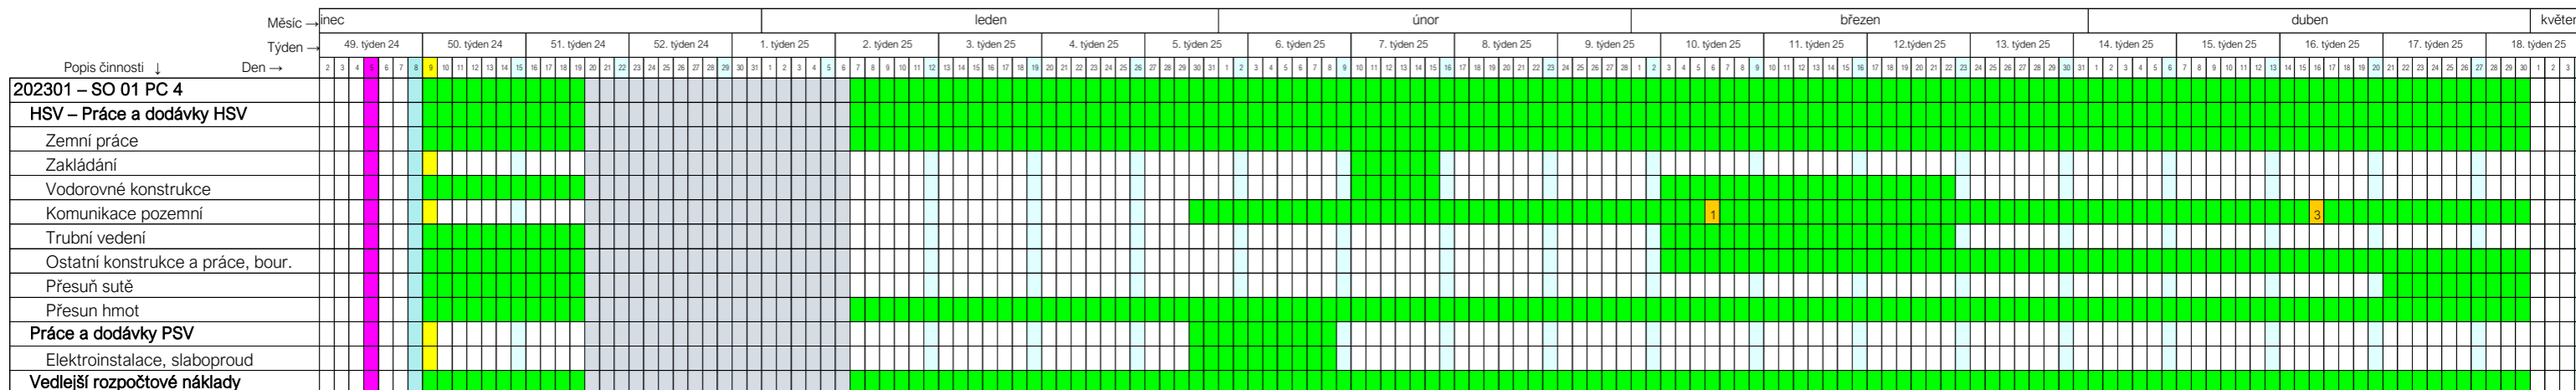


- nabytí účinnosti smlouvy
- den předání staveniště/zahájení prací
- provádění prací
- přerušení prací
- uzlový bod

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1 | 1. uzlový bod – dokončení pokládky štěrkodrti na C4 | 13. týden, do 06.03.2025 – 91 dnů |
| 2 | 2. uzlový bod – dokončení pokládky štěrkodrti na C6 | 14. týden, do 10.04.2025 – 126 dnů |
| 3 | 3. uzlový bod dokončení pokládky penetračního makadamu na C4 a C6 | 16. týden, do 16.04.2025 – 132 dnů |

V případě nevhodných klimatických podmínek, může dojít k mírnému posunu data realizace u činností, které jsou na vhodných klimatických podmínkách závislé.

Aktualizováno 19.12.2024

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ – POLNÍ CESTY TCHOŘOVICE

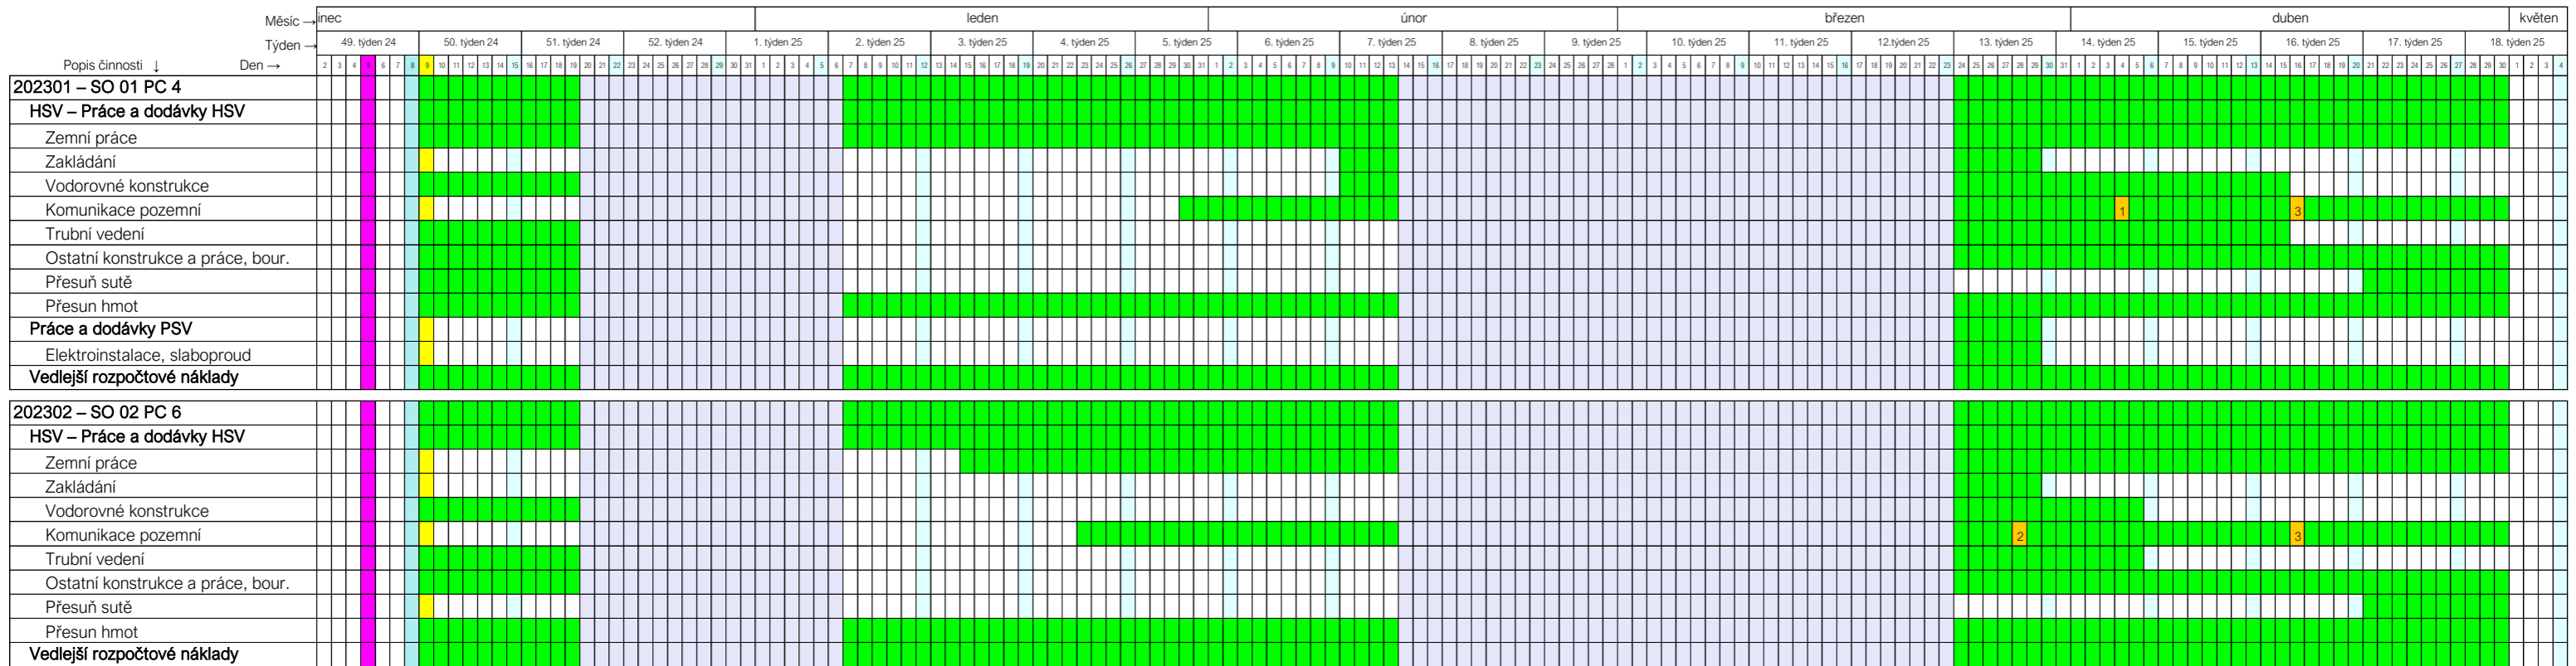

- nabytí účinnosti smlouvy
- den předání staveniště/zahájení prací
- provádění prací
- přerušení prací
- uzlový bod

1	1. uzlový bod – dokončení pokládky šterkodrti na C4	14. týden, do 04.04.2025 – 120 dnů	
2	2. uzlový bod – dokončení pokládky šterkodrti na C6	13. týden, do 28.03.2025 – 113 dnů	
3	3. uzlový bod dokončení pokládky penetračního makadamu na C4 a C6	16. týden, do 16.04.2025 – 132 dnů	(zůstává)

V případě nevhodných klimatických podmínek, může dojít k mírnému posunu data realizace u činností, které jsou na vhodných klimatických podmínkách závislé.

Aktualizováno 14.02.2025
