

**Záznam z výrobního výboru akce:
"Realizace společných zařízení KoPÚ Medlov u Uničova – II. etapa"**

konaného 6. února 2018 v kanceláři obecního úřadu Medlov

Přítomni dle prezenční listiny:

Obec Medlov
Státní pozemkový úřad (Olomouc)
AGPOL s.r.o., Olomouc
AGROBEN Střelice
MESPOL Medlov, a.s.
Soukromý zemědělec
Soukromý zemědělec

Ing. Jan Zahradníček- starosta
Ing. Michal Malý
Ing. Jakub Feltl, Ph.D.
Ing. Jan Šišma
JUDr. Eva Škopová
Jakub Smyčka
Antonín Smyčka

Investorem akce je - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Účel jednání:

Zástupce SPÚ Olomouc svolal zúčastněné z důvodu prvního seznámení se zakázkou a jejím rozsahem. Účelem bylo rovněž odsouhlasení rozsahu zakázky a vymezení míst, které by mohly být z hlediska projektování i následné realizace problematické.

Řešené objekty:

SO 01 – Hlavní polní cesta HC4c s IP17 - P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 1529 m

Byl odsouhlasen rozsah, povrch i kategorie cesty. Bylo dohodnuto, že odvodnění pláně bude realizováno drenážním potrubím a zasakovací jímkou, místo svodného příkopu. Pro výsadbu IP 17 budou voleny výhradně ovocné druhy stromů (švestky, třešně, jabloně a hrušně). V první polovině IP se nachází stávající zeleň (keře, náletové dřeviny). Bylo dohodnuto, že pokud se nebude jednat o VKP, či jiný chráněný prvek (ověří JUDr. Škopová – Mespól) bude navrženo vykácení a nová výsadba i v tomto úseku. Rozsah kácení bude upřesněn ze strany obce Medlov. Bylo odsouhlaseno umístění hospodářských sjezdů (5 na pravé straně cesty, 3 na levé straně cesty).

Obec poskytne podklady o vodovodních řadech v dané lokalitě. Bude oslovena pí. Smrčková.

SO 02 – Hlavní polní cesta HC7 - P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 529 m

Byl odsouhlasen rozsah, povrch i kategorie cesty. Bylo upozorněno, že místo napojení na stávající cestu na začátku úseku zasahuje částečně do parcely firmy MESPOL Medlov, a.s. Bylo dohodnuto, že potřebnou část parcely obce s firmou smění či odkoupí. Projektant zašle výřez katastrální mapy a potřebnou výměru k odkupu. Samotný převod potom zařídí zástupci

obce Medlov a firmy MESPOL. Dle informací přítomných je drenážní potrubí umístěné cca v polovině cesty nefunkční a je možné jeho zrušení. Odvodnění pláně bude realizováno drenážním potrubím. Dále byl předložen požadavek na konkrétní umístění sjezdu do areálu zemědělského družstva (min. šířka sjezdu 6 m – optimálně 8 – 12 m) – viz zákres, který je součástí záznamu. Další dva sjezdy budou realizovány na levé straně cesty na začátku a konci úseku.

SO 03 – Hlavní polní cesta HC3b s IP12 a IP13 - P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 980 m

Byl odsouhlasen rozsah, povrch i kategorie cesty. Bylo dohodnuto, že odvodnění pláně bude realizováno drenážním potrubím a zasakovací jímkou, místo svodného příkopu. Projektant vznesl dotaz ohledně stávající betonové skruže s vodovodním šoupátkem, která je přímo v trase navrhované cesty. Nikdo z přítomných neměl bližší informace o tomto zařízení. JUDr. Škopová však slíbila tuto situaci ověřit. Dále bylo upozorněno na křížení s trasou vodovodu (přivaděč Medlov – Hlivice) – přesné podklady poskytne obec Medlov. Bylo dohodnuto umístění hospodářských sjezdů (dva na cca uprostřed úseku a dva na konci úseku). Dále bylo dohodnuto rozšíření na začátku úseku (v místě prvního oblouku). Pro výsadbu IP 12 a IP 13 budou voleny výhradně ovocné druhy stromů (švestky, třešně, jabloně a hrušně).

Dle průběhu jednání zapsal:

Ing. Jakub Feltl, Ph.D.

Podpisy přítomných viz prezenční listina

MESPOL Medlov, a.s., IČ 25816403,
Medlov238, 783 91 Medlov

AGPOL s.r.o.
Ing. Jakub Feltl, Ph.D.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

Připomínky k akci: "Realizace společných zařízení KoPÚ Medlov u Uničova – II. etapa",
investorem akce je Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc

K řešenému objektu:

SO 01 – Hlavní polní cesta HC4c s IP17 - P5,0/30, s asfalt. povrchem v délce 1529 m

Na jednání bylo odsouhlaseno umístění hospodářských sjezdů dále jen HS (5 na pravé straně cesty, 3 na levé straně cesty). **Nově** MESPOL Medlov a.s. požaduje **přidat HS vedle P14 na pozemek p.č. 3597** viz přiložený snímek

SO 02 – Hlavní polní cesta HC7 - P5,0/30, s asfalt. povrchem v délce 529 m

Dle informací přítomných na jednání ze dne 6. 2. 2018 je drenážní potrubí umístěné cca v polovině cesty nefunkční a je možné jeho zrušení- **není pravda - drenážní potrubí je funkční a je nutné jej zachovat !!**

Dále byl předložen požadavek na konkrétní umístění sjezdu do areálu zemědělského družstva (min. šířka sjezdu 6 m – **optimálně 8 – 12 m**) – viz zákres, který je součástí záznamu.

SO 03 – Hlavní polní cesta HC3b s IP12 a IP13 - P5,0/30, s asfalt. povrchem v délce 980 m

K dotazu ohledně stávající betonové skruže s vodovodním šoupátkem, která je přímo v trase navrhované cesty – jedná se o **vodovod Obce Medlov** (přivaděč Medlov – Hlívce) – přesné podklady poskytne Obec Medlov.

Ing. Přemysl Duda
ředitel MESPOL Medlov, a. s.


V Medlově dne 9. 2. 2018



MESPOL Medlov, a.s.
č.p. 238
783 91 Medlov
DIČ: CZ25816403
IČ: 25816403

u Uničova



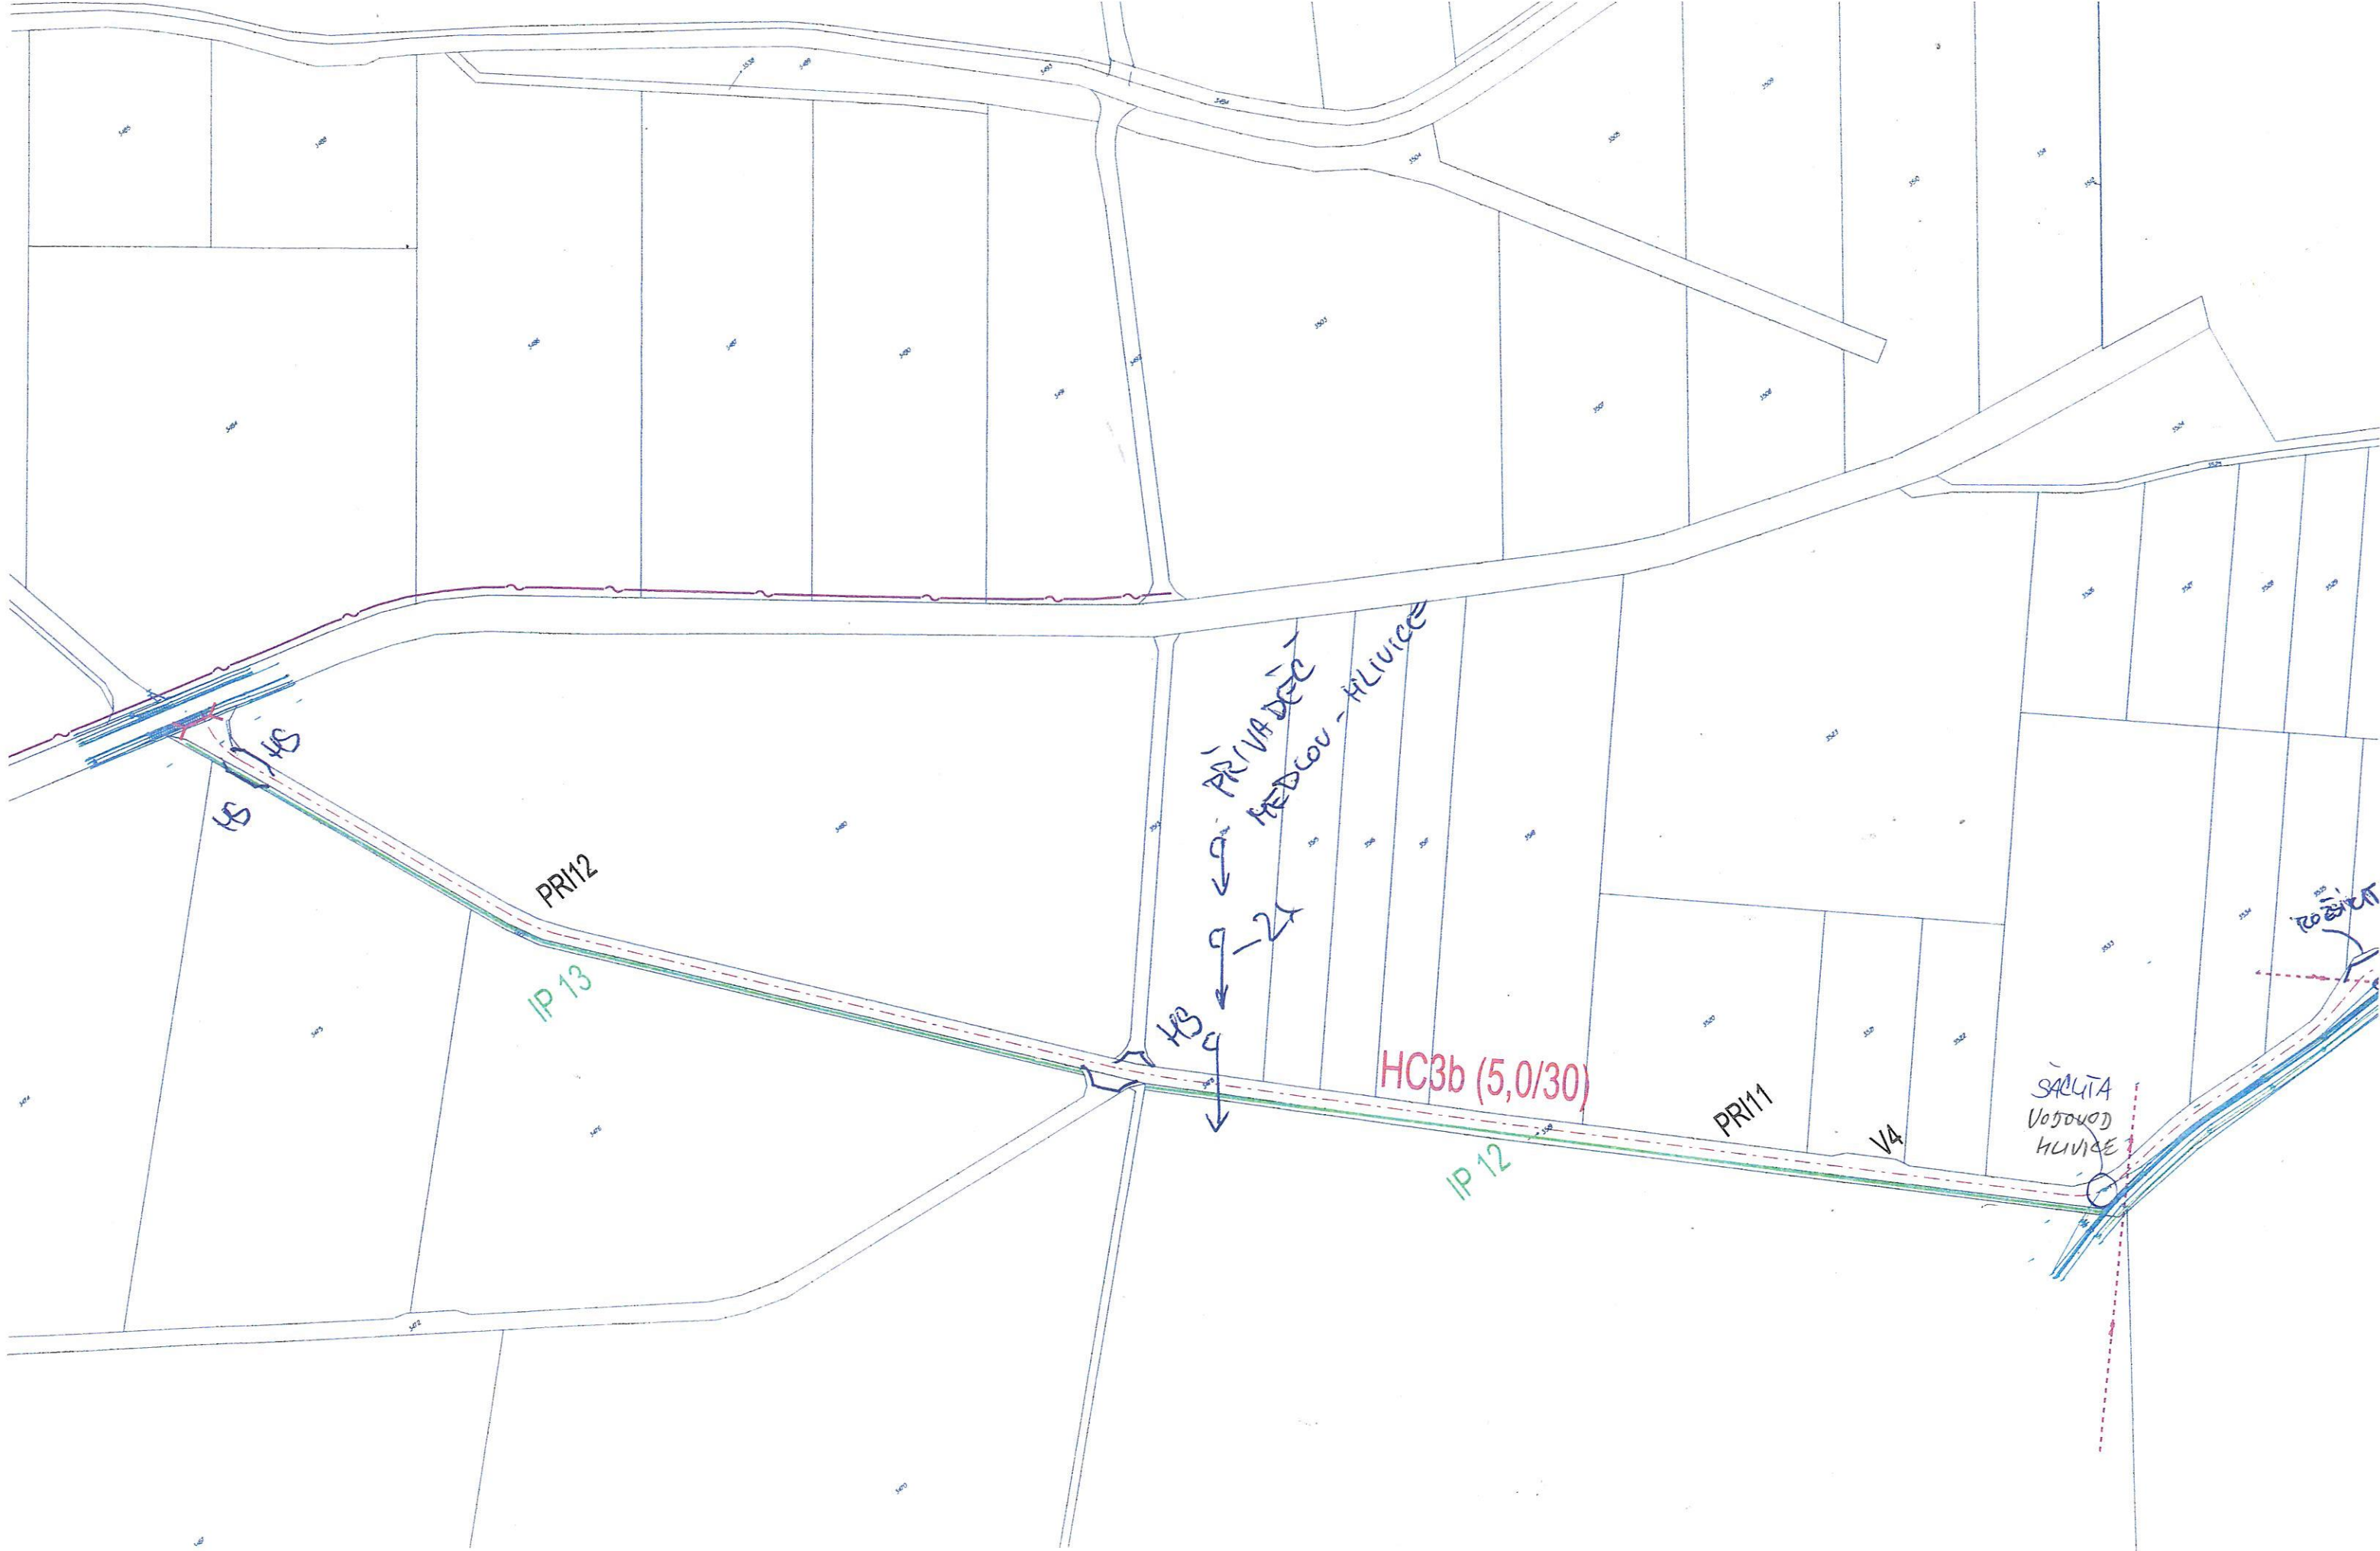





Medlov u Uničova

PRI17

IP17

HS

HC4c (5,0/30)

HS

HS

V8

DIAMO


VRT OP

OP

1/2

Za Bittnerovým



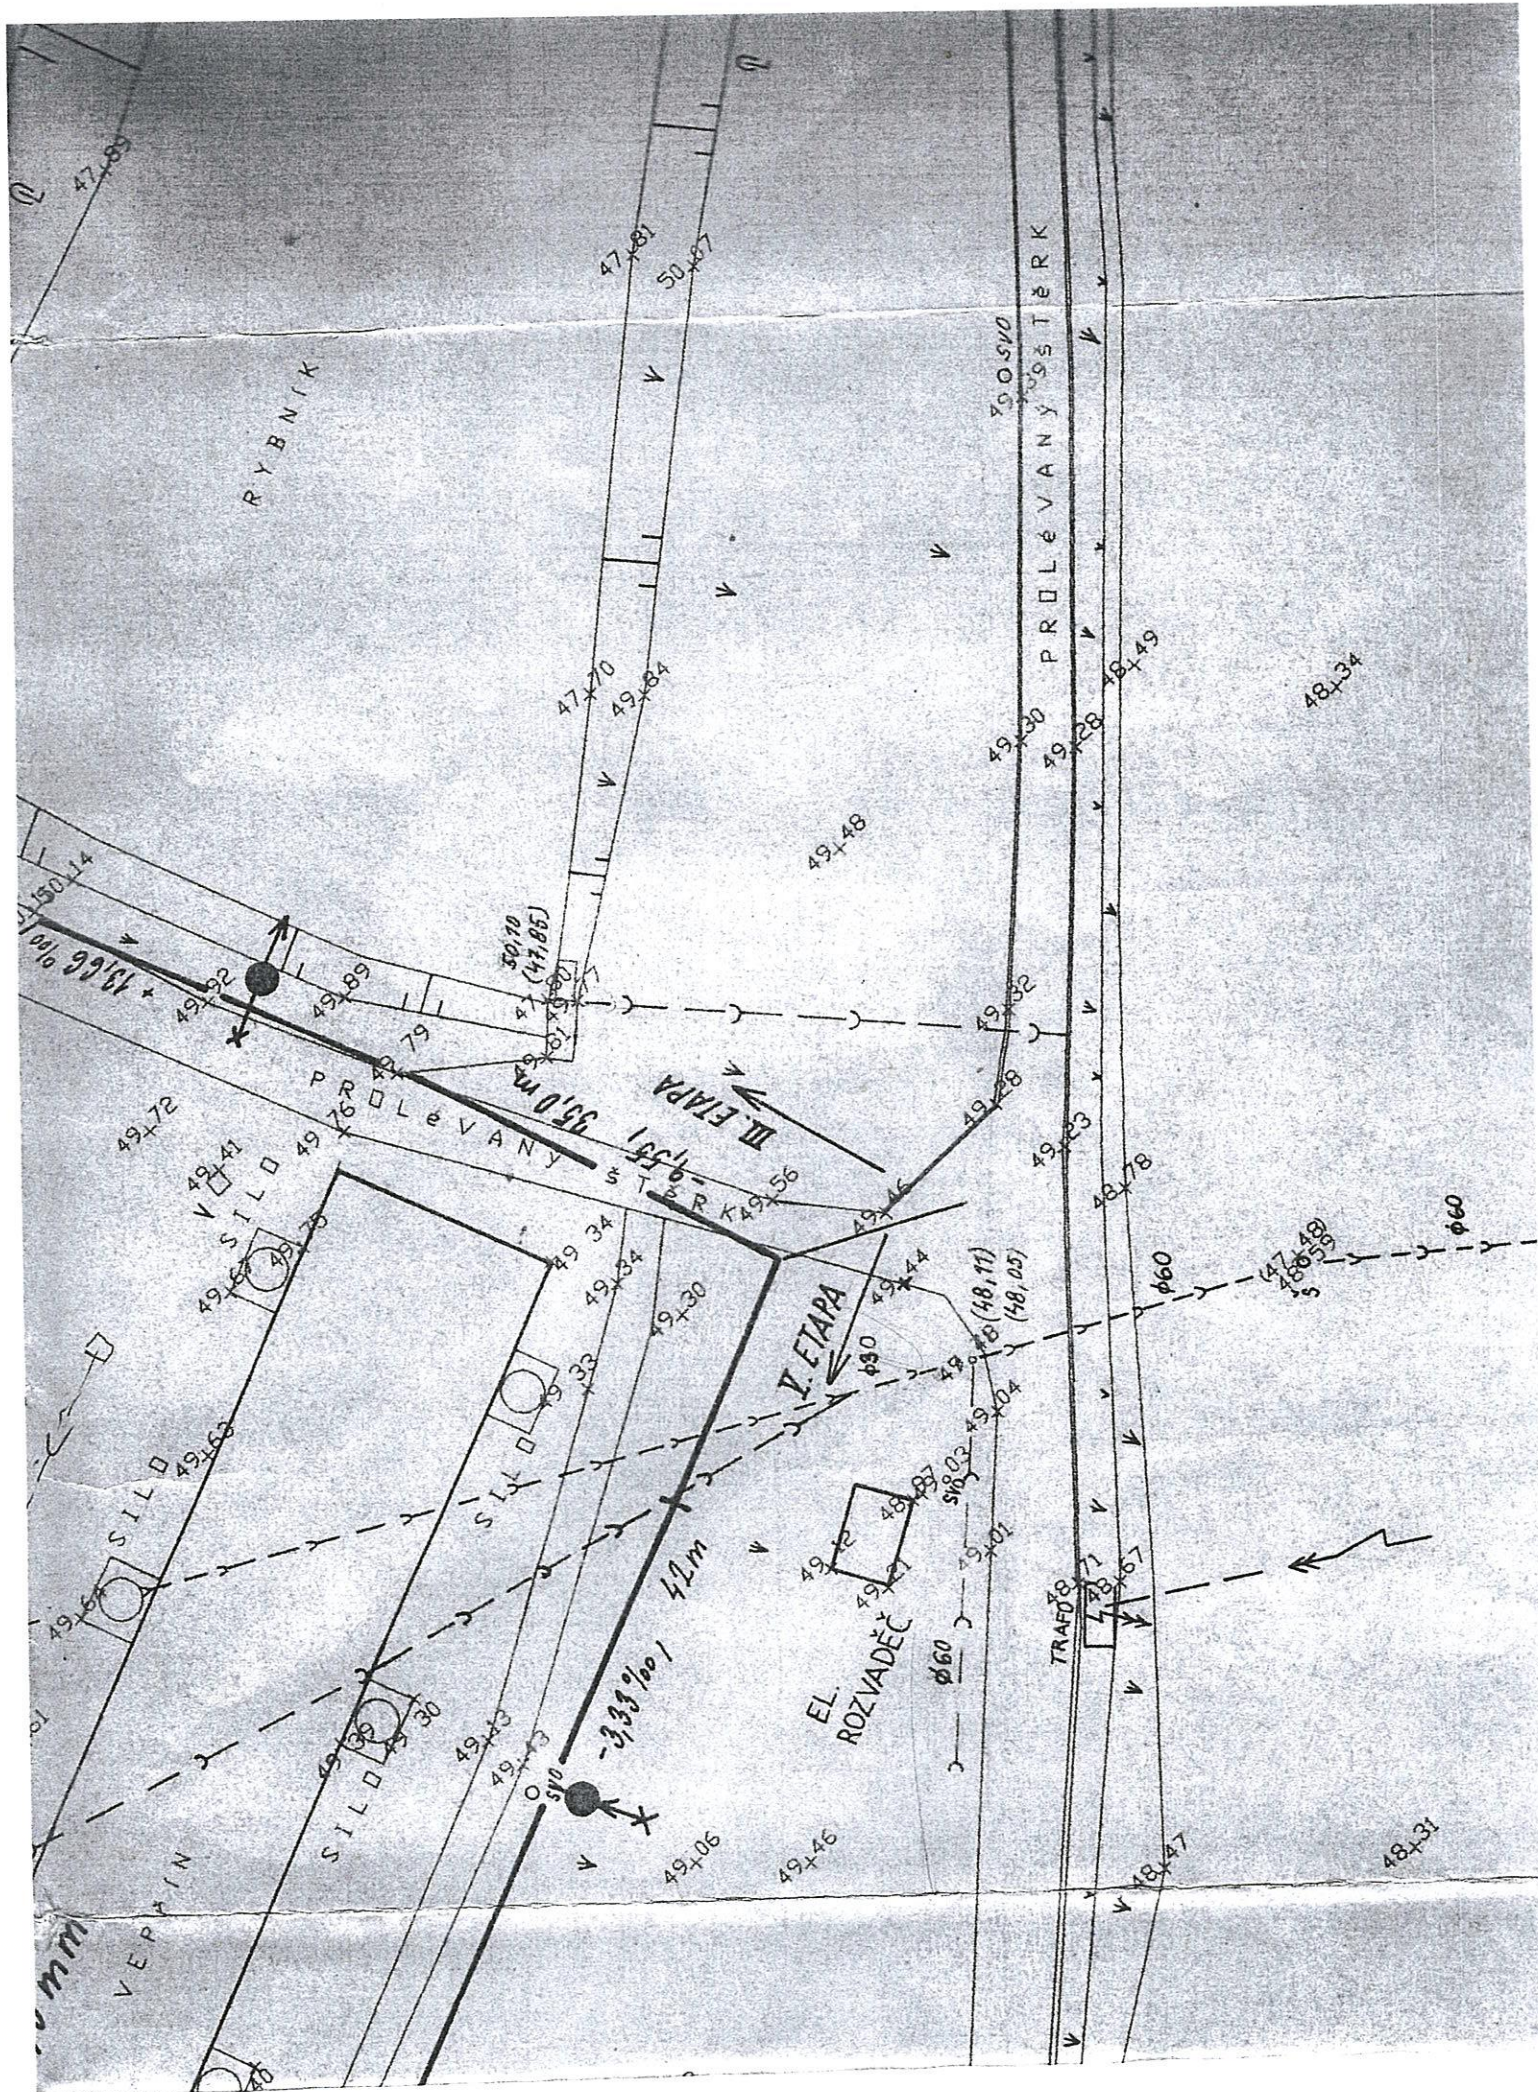

z projednání

kterého se účastnili dne 6. 2. 2018

[illegible]
