Objekt	Název	Popis prací
	„RSZ v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I"	aktualizace k 10.6.2025
SO 01	Hlavní polní cesta HPC3	
		odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně
		AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem
		drenáž
		zpevněná krajnice, ohumusování ,osetí
	UB 1. - 30. 5. 2025	konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32
		ACP 16+, ACO 11
		Propustek DN 800 v km 0,863 40
		vybourání stavajícího propustku
		odkop na ZS
		betonáž zákl. pod čela propustku
		podkladní beton
		osazení ŽB trub DN 800
		bednění a betonáž čel propustku,obetonování ŽB trub
		výkop a betonáž stabilizačních prahů
		provedení kamenné dlažby do betonu + zához LK
SO 02	Rekonstrukce mostu M1	
		odfréz. stávajího AHV, vybourání stávajícího mostu
		vysvahování bočních stran výkopu po stáv.mostu
		převedení vody potrubím DN 800, těsnící hrázky
		vyhloubení jímky pro čerpadlo,přečerpávání vody
		výkop pro čela mostu + betonáž spodních částí čel
	UB 8. - 11. 10. 2024	odkop pro ZS, betonáž podkladního betonu
		osazení ŽB dílců rámového propustku
	UB 9. - 8. 4. 2025	bednění a betonáž čel propustku a říms
		obetonování rámové propusti
		výkop a betonáž stabilizačních prahů
		provedení kamenné dlažby do betonu + zához LK
		oprava spárování stávající opěrné zdi
		montáž zábradlí
		ACP 16+, ACO 11
SO 03	Hlavní polní cesta HPC4	
		odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně
		AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem
		drenáž
		zpevněná krajnice, ohumusování, osetí
	UB 2. - 30. 7. 2025	kční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32, VPC ŠD 0/125 a 0/90
		ACP 16+, ACO 11
		Propustek DN 800
		vybourání stavajícího propustku
		odkop na ZS
		betonáž zákl. pod čela propustku
		podkladní beton
		osazení ŽB trub DN 800
		bednění a betonáž čel propustku,obetonování ŽB trub
		výkop a betonáž stabilizačních prahů
		provedení kamenné dlažby do betonu + zához LK
SO 04	Hlavní polní cesta HPC5	
		ruční odkop,vložení kabelů Cetin do půlené chráničky
		odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně
		AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem
		drenáž
		zpevněná krajnice, ohumusování, osetí
	UB 3. - 22. 11. 2024	konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32
		ACP 16+, ACO 11
SO 05	Hlavní polní cesta HPC8	
		odfrézování stávajícího AHV
		odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně
		AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem
		drenáž
		zpevněná krajnice, ohumusování, osetí
	UB 4. - 4. 7. 2025	konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32, VPC - ŠD 32/63
		ACP 16+, ACO 11
SO 06	Vedlejší polní cesta VPC12a+b	
		odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně
	Zvýšený obsah PAU a As	AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem
		drenáž
		zpevněná krajnice, ohumusování, osetí
	UB 5.- 31. 8. 2025	konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32
		ACP 16+, ACO 11
SO 08	Vedlejší polní cesta VPC13	
		odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně
		AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem
		drenáž
		zpevněná krajnice, ohumusování, osetí
	UB 6. - 15. 5. 2025	konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32
		ACP 16+, ACO 11
SO 09	Vedlejší polní cesta VPC28	
		odfrézování stávajícího AHV
		odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně
	Zvýšený obsah PAU a As	AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem
		drenáž
		zpevněná krajnice, ohumusování, osetí
	UB 7. - 29. 8. 2025	konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32
		ACP 16+, ACO 11

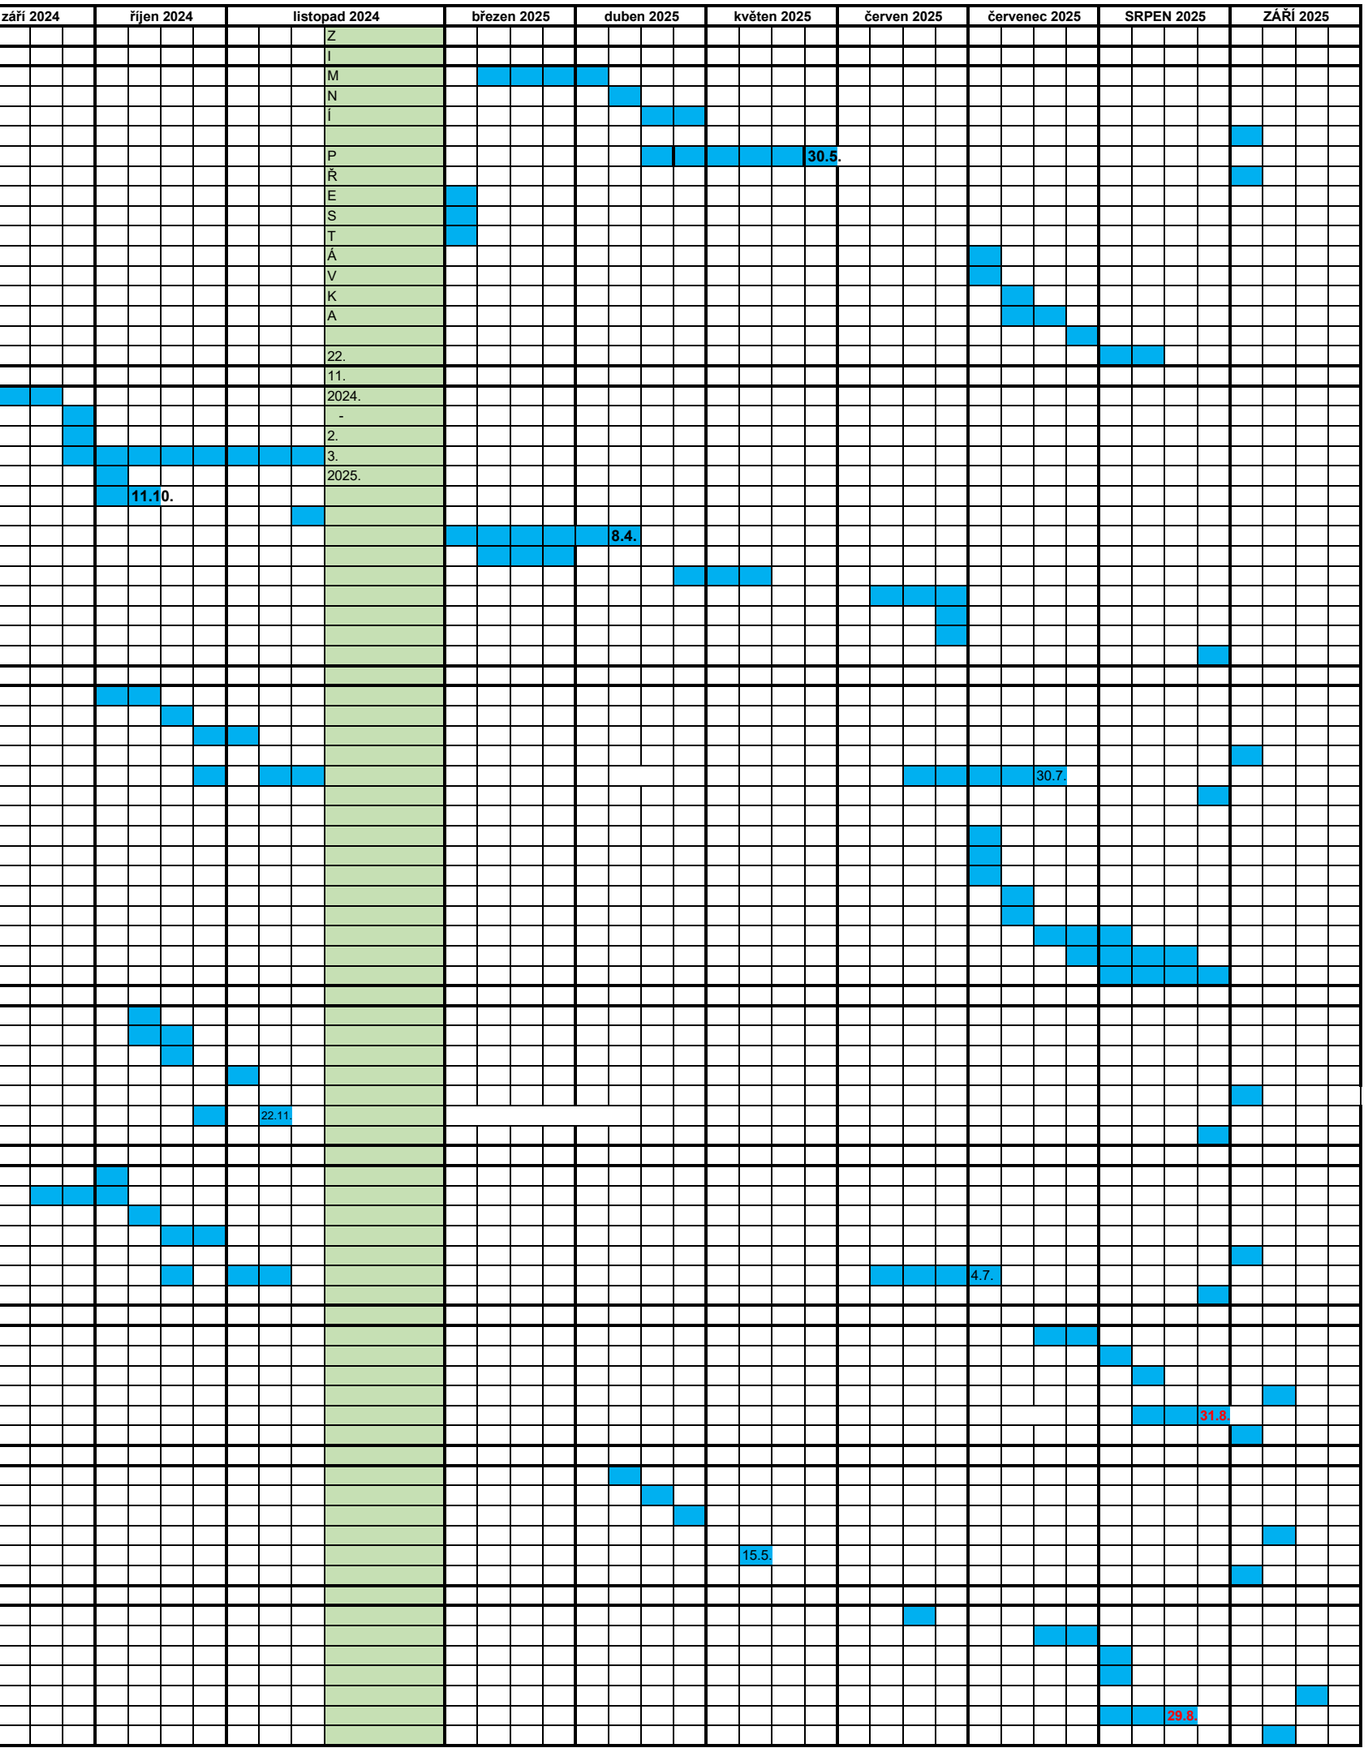

Aktualizace
k 10.6.2025
