| Objekt | Název | Popis prací |
|---|---|---|
| | **„RSZ v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I"** | aktualizace k 10.6.2025 |
| SO 01 | Hlavní polní cesta HPC3 | |
| | | odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně |
| | | AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem |
| | | drenáž |
| | | zpevněná krajnice, ohumusování ,osetí |
| | UB 1. - 30. 5. 2025 | konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32 |
| | | ACP 16+, ACO 11 |
| | | Propustek DN 800 v km 0,863 40 |
| | | vybourání stavajícího propustku |
| | | odkop na ZS |
| | | betonáž zákl. pod čela propustku |
| | | podkladní beton |
| | | osazení ŽB trub DN 800 |
| | | bednění a betonáž čel propustku,obetonování ŽB trub |
| | | výkop a betonáž stabilizačních prahů |
| | | provedení kamenné dlažby do betonu + zához LK |
| SO 02 | Rekonstrukce mostu M1 | |
| | | odfréz. stávajího AHV, vybourání stávajícího mostu |
| | | vysvahování bočních stran výkopu po stáv.mostu |
| | | převedení vody potrubím DN 800, těsnící hrázky |
| | | vyhloubení jímky pro čerpadlo,přečerpávání vody |
| | | výkop pro čela mostu + betonáž spodních částí čel |
| | UB 8. - 11. 10. 2024 | odkop pro ZS, betonáž podkladního betonu |
| | | osazení ŽB dílců rámového propustku |
| | UB 9. - 8. 4. 2025 | bednění a betonáž čel propustku a říms |
| | | obetonování rámové propusti |
| | | výkop a betonáž stabilizačních prahů |
| | | provedení kamenné dlažby do betonu + zához LK |
| | | oprava spárování stávající opěrné zdi |
| | | montáž zábradlí |
| | | ACP 16+, ACO 11 |
| SO 03 | Hlavní polní cesta HPC4 | |
| | | odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně |
| | | AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem |
| | | drenáž |
| | | zpevněná krajnice, ohumusování, osetí |
| | UB 2. - 30. 7. 2025 | kční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32, VPC ŠD 0/125 a 0/90 |
| | | ACP 16+, ACO 11 |
| | | Propustek DN 800 |
| | | vybourání stavajícího propustku |
| | | odkop na ZS |
| | | betonáž zákl. pod čela propustku |
| | | podkladní beton |
| | | osazení ŽB trub DN 800 |
| | | bednění a betonáž čel propustku,obetonování ŽB trub |
| | | výkop a betonáž stabilizačních prahů |
| | | provedení kamenné dlažby do betonu + zához LK |
| SO 04 | Hlavní polní cesta HPC5 | |
| | | ruční odkop,vložení kabelů Cetin do půlené chráničky |
| | | odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně |
| | | AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem |
| | | drenáž |
| | | zpevněná krajnice, ohumusování, osetí |
| | UB 3. - 22. 11. 2024 | konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32 |
| | | ACP 16+, ACO 11 |
| SO 05 | Hlavní polní cesta HPC8 | |
| | | odfrézování stávajícího AHV |
| | | odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně |
| | | AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem |
| | | drenáž |
| | | zpevněná krajnice, ohumusování, osetí |
| | UB 4. - 4. 7. 2025 | konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32, VPC - ŠD 32/63 |
| | | ACP 16+, ACO 11 |
| SO 06 | Vedlejší polní cesta VPC12a+b | |
| | | odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně |
| | Zvýšený obsah PAU a As | AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem |
| | | drenáž |
| | | zpevněná krajnice, ohumusování, osetí |
| | UB 5.- 31. 8. 2025 | konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32 |
| | | ACP 16+, ACO 11 |
| SO 08 | Vedlejší polní cesta VPC13 | |
| | | odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně |
| | | AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem |
| | | drenáž |
| | | zpevněná krajnice, ohumusování, osetí |
| | UB 6. - 15. 5. 2025 | konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32 |
| | | ACP 16+, ACO 11 |
| SO 09 | Vedlejší polní cesta VPC28 | |
| | | odfrézování stávajícího AHV |
| | | odkop pro spodní stavbu na úroveň zemní pláně |
| | Zvýšený obsah PAU a As | AZ - stabilizace zeminy vápenným hydrátem |
| | | drenáž |
| | | zpevněná krajnice, ohumusování, osetí |
| | UB 7. - 29. 8. 2025 | konstrukční vrstvy, ŠD 0/63 a 0/32 |
| | | ACP 16+, ACO 11 |

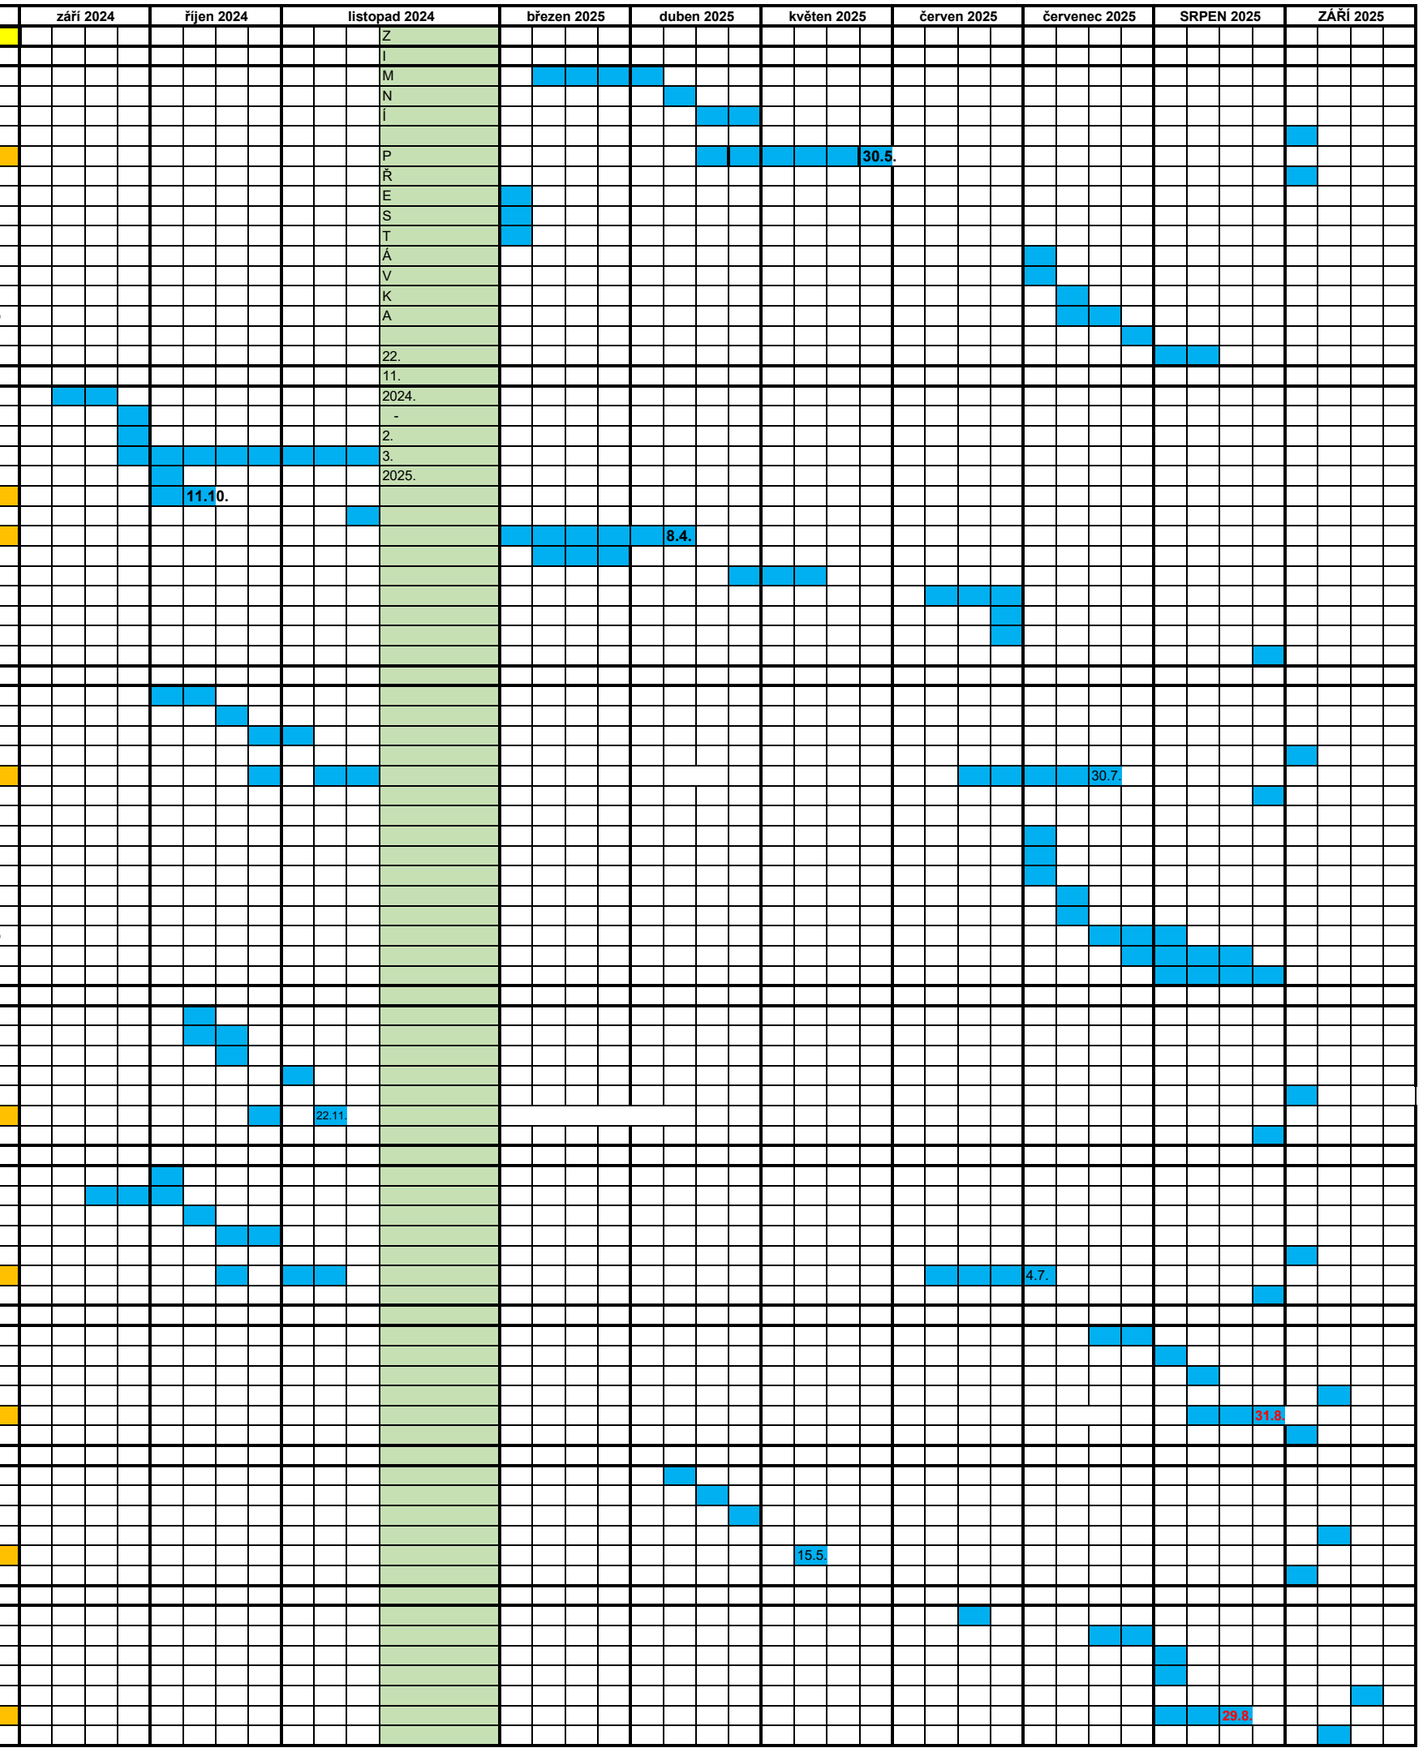


Aktualizace
k 10.6.2025
zpracoval :
David Ďulák
