HMG - Vodohospodářská opatření v k.ú. Chrást u Plzně

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2					
3		**Rybník R1**	**32 dny**	**19.03. 25**	**01.05. 25**
4		Betonáž stěn - Dilatační celek 1	1 den	19.03. 25	19.03. 25
5		Bednění + armování - Dilatační celek 1	3 dny	20.03. 25	24.03. 25
6		Betonáž stěn - Dilatační celek 2	1 den	25.03. 25	25.03. 25
7		Výplňový beton základů	1 den	27.03. 25	27.03. 25
8		Betonová deska dna	3 dny	28.03. 25	01.04. 25
9		Kamenný obklad dna	3 dny	02.04. 25	04.04. 25
10		Zásypy hráze	7 dny	07.04. 25	15.04. 25
11		Patka a rovnanina z lomového kamene	5 dny	16.04. 25	22.04. 25
12		Kamenný obklad stěn	5 dny	16.04. 25	22.04. 25
13		Přelivná válcová hrana	1 den	30.04. 25	30.04. 25
14		Osazení zámečnických prvků	1 den	01.05. 25	01.05. 25
15					
16		**Rybník R2**	**27 dny**	**26.03. 25**	**01.05. 25**
17		Bednění + armování stěn 1/2	4 dny	26.03. 25	31.03. 25
18		Betonáž stěn 1/2	1 den	01.04. 25	01.04. 25
19		Bednění + armování stěn 2/2	2 dny	02.04. 25	03.04. 25
20		Betonáž 2/2	1 den	04.04. 25	04.04. 25
21		Výplň beton pod desku	2 dny	07.04. 25	08.04. 25
22		Betonová deska dna	2 dny	09.04. 25	10.04. 25
23		Kamenný obklad dna	3 dny	11.04. 25	15.04. 25
24		Zásypy hráze	7 dny	16.04. 25	24.04. 25
25		Patka a rovnanina z lomového kamene	5 dny	25.04. 25	01.05. 25
26		Kamenný obklad stěn	5 dny	23.04. 25	29.04. 25
27		Přelivná válcová hrana	1 den	30.04. 25	30.04. 25
28		Osazení zámečnických prvků	1 den	01.05. 25	01.05. 25
29					
30		**Tůň T1**	**12 dny**	**27.03. 25**	**11.04. 25**
31		Betonáž	1 den	27.03. 25	27.03. 25
32		Odbednění	1 den	31.03. 25	31.03. 25
33		Výkop zámku + zásyp zámku	2 dny	01.04. 25	02.04. 25
34		Zásyp prahu	3 dny	03.04. 25	07.04. 25
35		Patka a rovnanina z lomového kamene	4 dny	08.04. 25	11.04. 25
36					
37		**Tůň T2**	**19 dny?**	**27.03. 25**	**22.04. 25**
38		Betonáž	1 den	27.03. 25	27.03. 25
39		Odbednění	1 den	31.03. 25	31.03. 25
40		Výkop zámku + zásyp zámku	1 den	14.04. 25	14.04. 25
41		Zásyp prahu	2 dny	15.04. 25	16.04. 25
42		Patka a rovnanina z lomového kamene	4 dny	17.04. 25	22.04. 25
43					
44		**Tůň T3**	**26 dny**	**27.03. 25**	**01.05. 25**
45		Betonáž	1 den	27.03. 25	27.03. 25
46		Odbednění	1 den	31.03. 25	31.03. 25
47		Výkop zámku + zásyp zámku	1 den	23.04. 25	23.04. 25
48		Zásyp prahu	2 dny	24.04. 25	25.04. 25
49		Patka a rovnanina z lomového kamene	4 dny	28.04. 25	01.05. 25
50					
51		**Komunikace**	**15 dny**	**05.05. 25**	**23.05. 25**
52		Odvoz provizorního mat. + drenáž	4 dny	05.05. 25	08.05. 25
53		Frézování	1 den	09.05. 25	09.05. 25
54		Technologická pauza po frézování	5 dny	12.05. 25	16.05. 25
55		Skladba komunikace	5 dny	19.05. 25	23.05. 25
56		Dokončení stavebních prací	1 den?	24.05. 25	24.05. 25
57		Předání dokladů ke kolaudaci	1 den?	09.05. 25	09.05. 25
58		Výsadba zeleně	3 dny	26.05. 25	28.05. 25

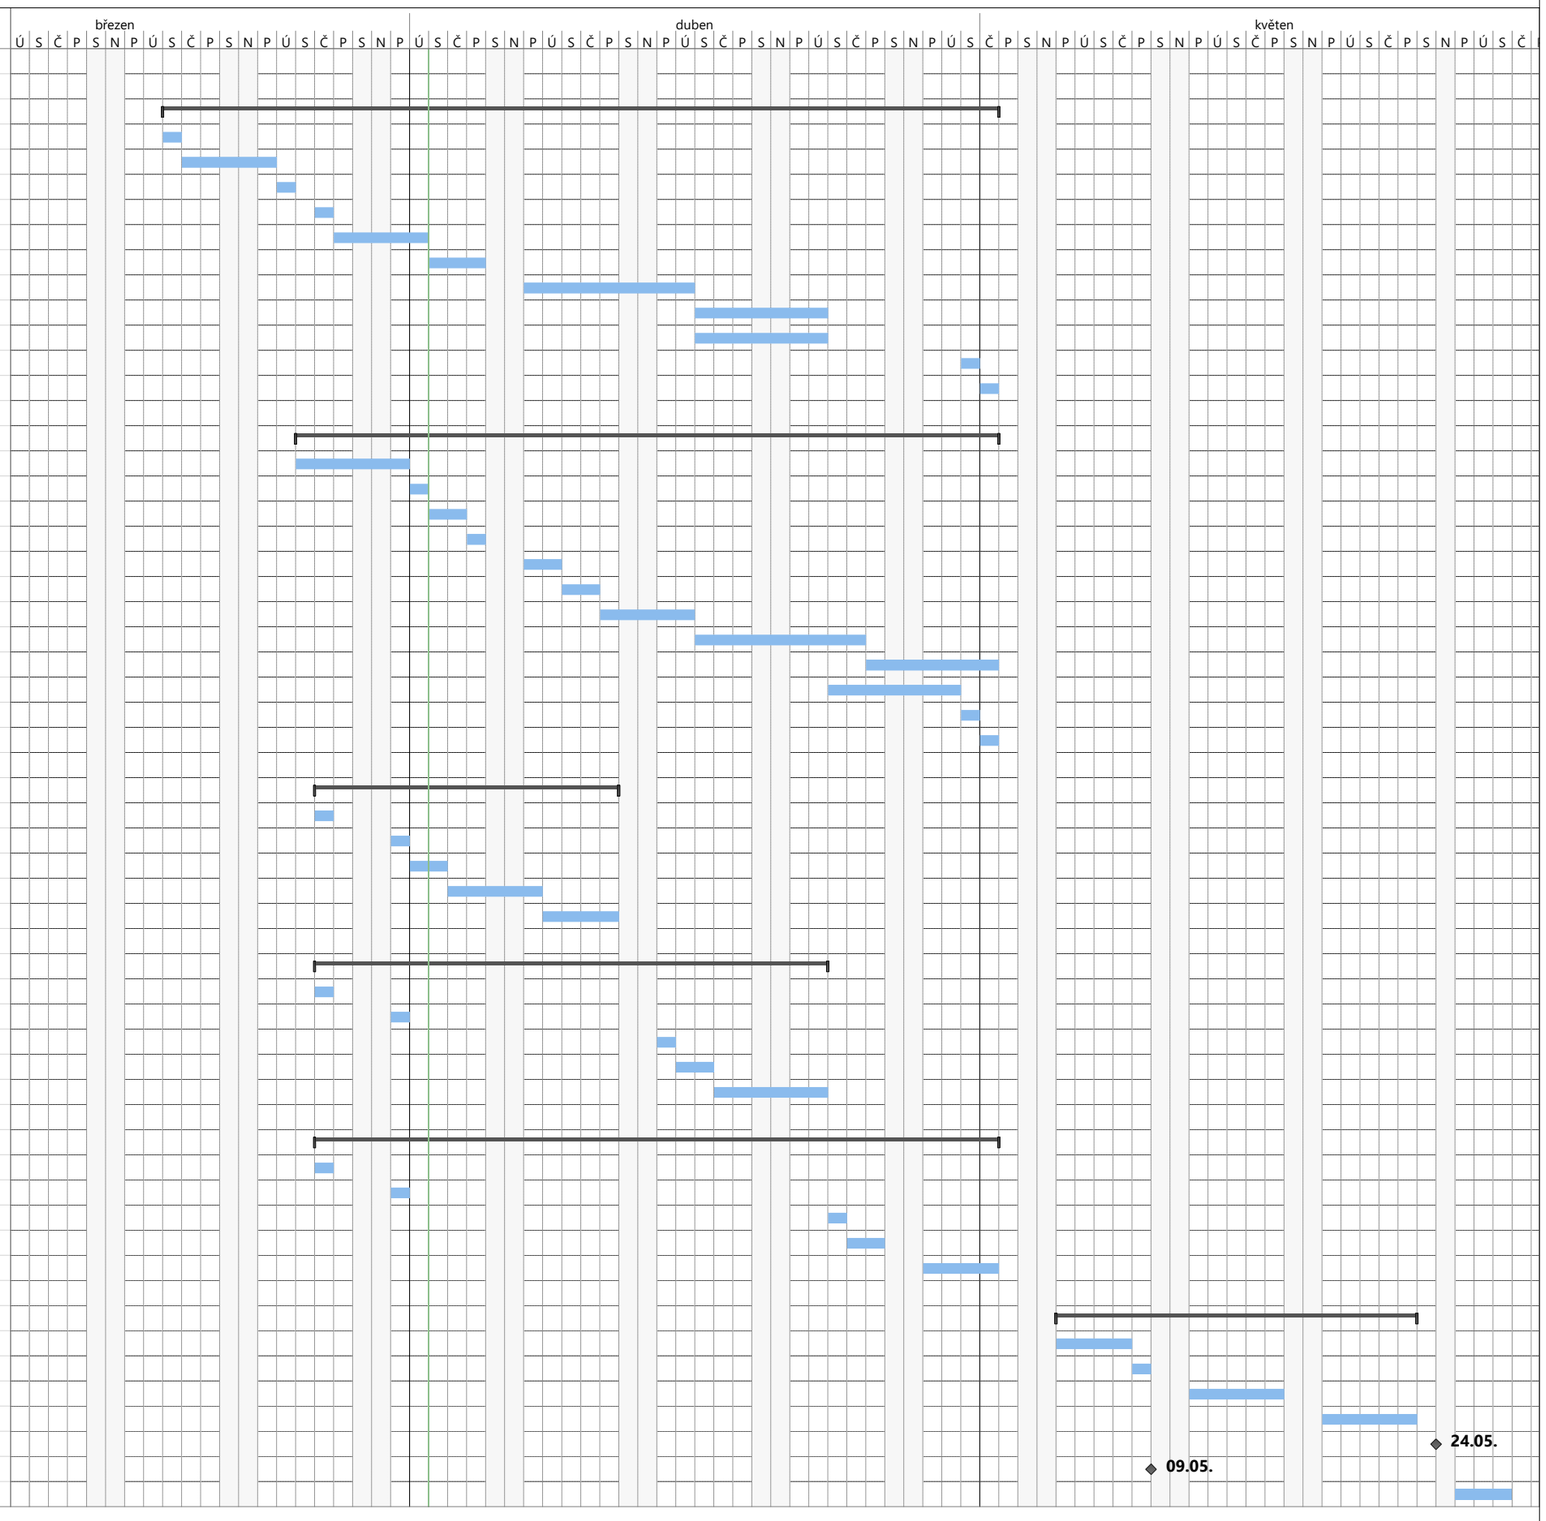

HMG - Vodohospodářská opatření v k.ú. Chrást u Plzně
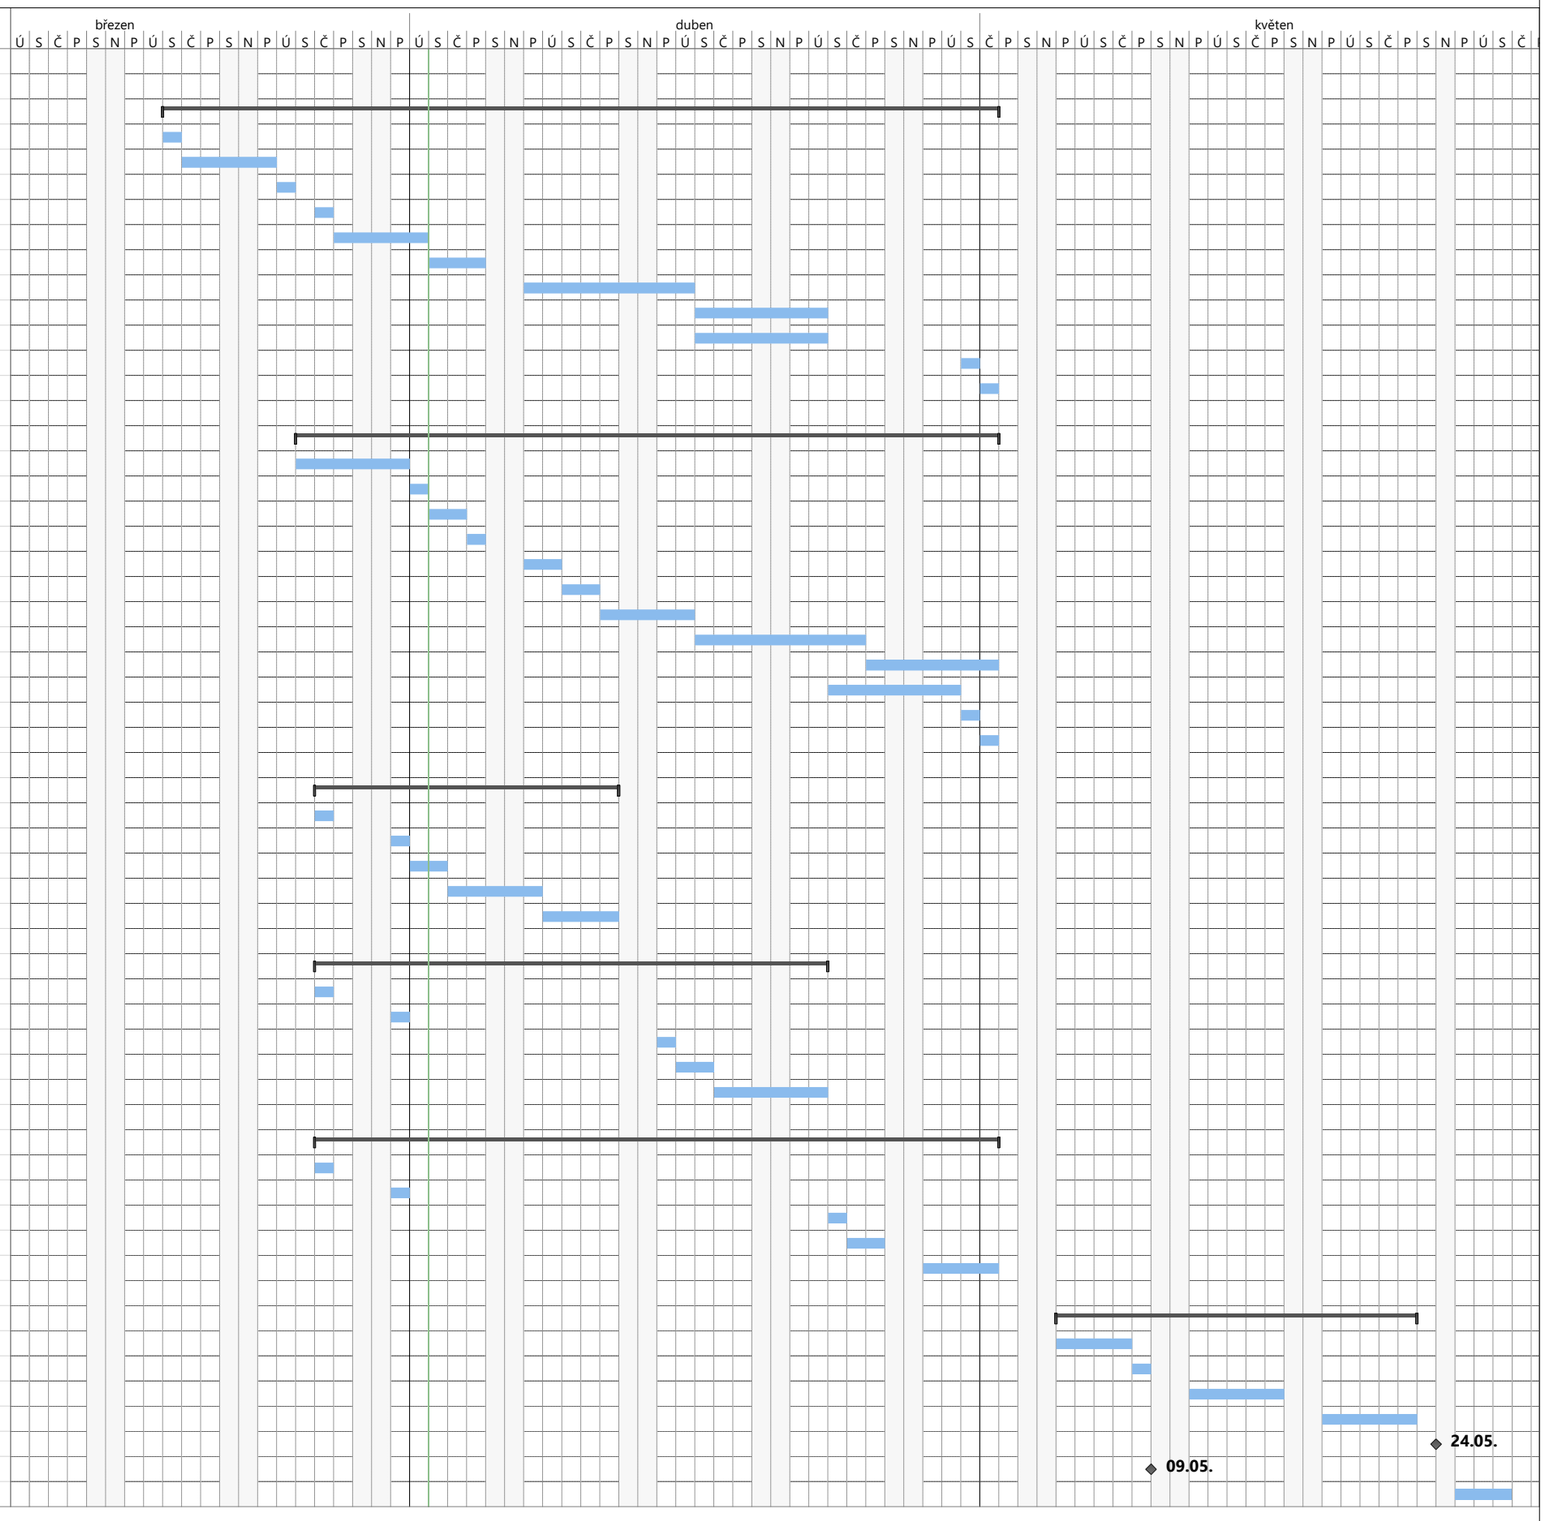
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2					
3		**Rybník R1**	**32 dny**	**19.03. 25**	**01.05. 25**
4		Betonáž stěn - Dilatační celek 1	1 den	19.03. 25	19.03. 25
5		Bednění + armování - Dilatační celek 1	3 dny	20.03. 25	24.03. 25
6		Betonáž stěn - Dilatační celek 2	1 den	25.03. 25	25.03. 25
7		Výplňový beton základů	1 den	27.03. 25	27.03. 25
8		Betonová deska dna	3 dny	28.03. 25	01.04. 25
9		Kamenný obklad dna	3 dny	02.04. 25	04.04. 25
10		Zásypy hráze	7 dny	07.04. 25	15.04. 25
11		Patka a rovnanina z lomového kamene	5 dny	16.04. 25	22.04. 25
12		Kamenný obklad stěn	5 dny	16.04. 25	22.04. 25
13		Přelivná válcová hrana	1 den	30.04. 25	30.04. 25
14		Osazení zámečnických prvků	1 den	01.05. 25	01.05. 25
15					
16		**Rybník R2**	**27 dny**	**26.03. 25**	**01.05. 25**
17		Bednění + armování stěn 1/2	4 dny	26.03. 25	31.03. 25
18		Betonáž stěn 1/2	1 den	01.04. 25	01.04. 25
19		Bednění + armování stěn 2/2	2 dny	02.04. 25	03.04. 25
20		Betonáž 2/2	1 den	04.04. 25	04.04. 25
21		Výplň beton pod desku	2 dny	07.04. 25	08.04. 25
22		Betonová deska dna	2 dny	09.04. 25	10.04. 25
23		Kamenný obklad dna	3 dny	11.04. 25	15.04. 25
24		Zásypy hráze	7 dny	16.04. 25	24.04. 25
25		Patka a rovnanina z lomového kamene	5 dny	25.04. 25	01.05. 25
26		Kamenný obklad stěn	5 dny	23.04. 25	29.04. 25
27		Přelivná válcová hrana	1 den	30.04. 25	30.04. 25
28		Osazení zámečnických prvků	1 den	01.05. 25	01.05. 25
29					
30		**Tůň T1**	**12 dny**	**27.03. 25**	**11.04. 25**
31		Betonáž	1 den	27.03. 25	27.03. 25
32		Odbednění	1 den	31.03. 25	31.03. 25
33		Výkop zámku + zásyp zámku	2 dny	01.04. 25	02.04. 25
34		Zásyp prahu	3 dny	03.04. 25	07.04. 25
35		Patka a rovnanina z lomového kamene	4 dny	08.04. 25	11.04. 25
36					
37		**Tůň T2**	**19 dny?**	**27.03. 25**	**22.04. 25**
38		Betonáž	1 den	27.03. 25	27.03. 25
39		Odbednění	1 den	31.03. 25	31.03. 25
40		Výkop zámku + zásyp zámku	1 den	14.04. 25	14.04. 25
41		Zásyp prahu	2 dny	15.04. 25	16.04. 25
42		Patka a rovnanina z lomového kamene	4 dny	17.04. 25	22.04. 25
43					
44		**Tůň T3**	**26 dny**	**27.03. 25**	**01.05. 25**
45		Betonáž	1 den	27.03. 25	27.03. 25
46		Odbednění	1 den	31.03. 25	31.03. 25
47		Výkop zámku + zásyp zámku	1 den	23.04. 25	23.04. 25
48		Zásyp prahu	2 dny	24.04. 25	25.04. 25
49		Patka a rovnanina z lomového kamene	4 dny	28.04. 25	01.05. 25
50					
51		**Komunikace**	**15 dny**	**05.05. 25**	**23.05. 25**
52		Odvoz provizorního mat. + drenáž	4 dny	05.05. 25	08.05. 25
53		Frézování	1 den	09.05. 25	09.05. 25
54		Technologická pauza po frézování	5 dny	12.05. 25	16.05. 25
55		Skladba komunikace	5 dny	19.05. 25	23.05. 25
56		Dokončení stavebních prací	1 den?	24.05. 25	24.05. 25
57		Předání dokladů ke kolaudaci	1 den?	09.05. 25	09.05. 25
58		Výsadba zeleně	3 dny	26.05. 25	28.05. 25
