Průleh SP2 v k.ú. Kurdějov

Harmonogram

postupu realizace stavebních prací

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	
1	**Doba plnění**	**213 dny**	30.1. 17 – 30.8. 17
2	***Termín zahájení realizace stavebních prací***	***0 dny***	30.1. 17
3	přípravné práce	4 dny	30.1. 17 – 2.2. 17
4	**Část 1.: „Průleh SP2 v k.ú. Kurdějov“**	**194 dny**	3.2. 17 – 15.8. 17
5	kácení	45 dny	3.2. 17 – 19.3. 17
6	zemní práce, úprava pláně	165 dny	23.2. 17 – 6.8. 17
7	protipovodňová opěrná zeď	125 dny	10.3. 17 – 12.7. 17
8	odvodnění, žb konstrukce	60 dny	29.5. 17 – 27.7. 17
9	výsadba, ohumusování, osetí	42 dny	30.6. 17 – 10.8. 17
10	dokončovací práce	5 dny	11.8. 17 – 15.8. 17
11	***Termín dokončení stavebních prací***	***0 dny***	15.8. 17
12	***Termín předání a převzetí díla***	***0 dny***	30.8. 17

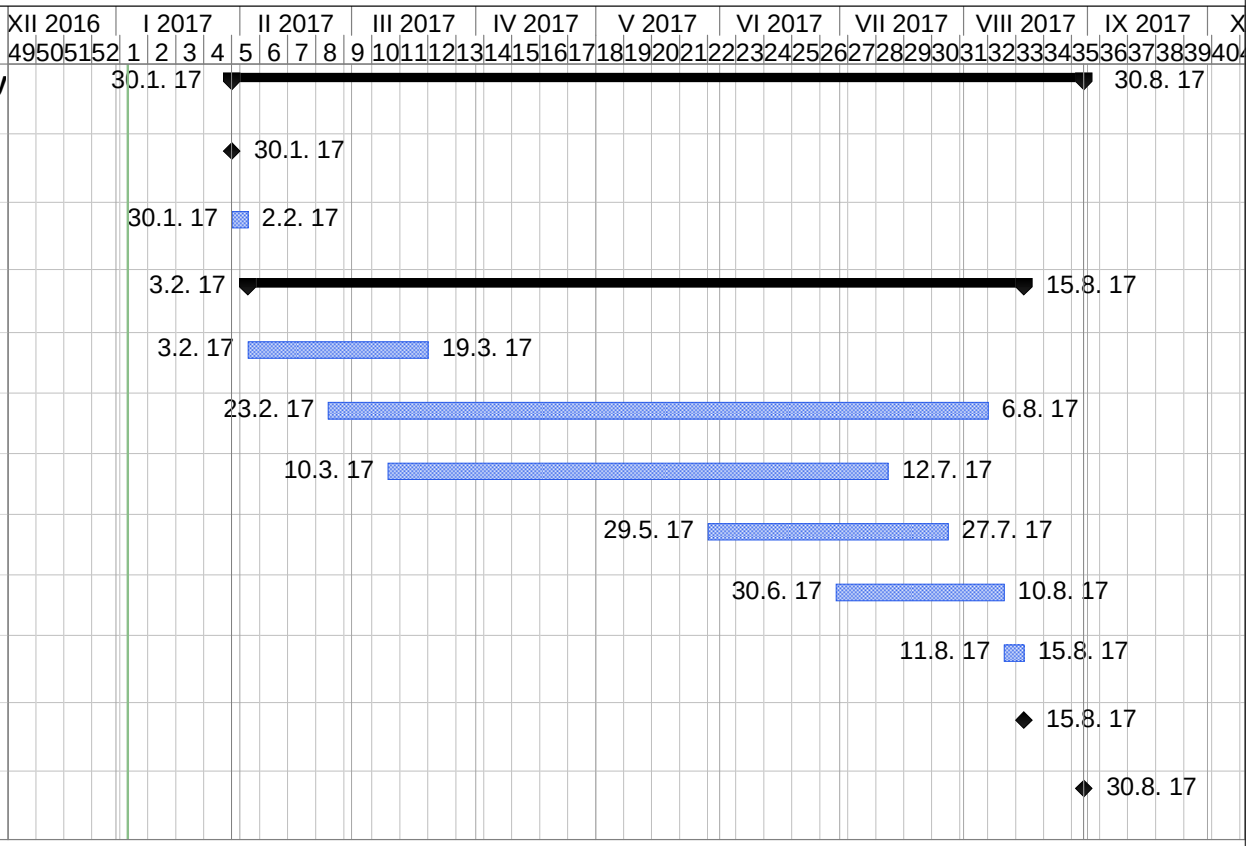

Projekt: Kurdějov_hmg_pt_2.mp
Datum: 4.1. 17

Úkol — Přerušení — Milník — Souhrnný
