

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0038

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená ing. Miroslavem Kotem , Supervizorem , Výstavba pevné přístupové sítě

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka Hradec Králové

se sídlem Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

IČ : 01312774

DIČ : není plátcem DPH

Zastoupená: RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 12.8.2015 pod č. 664761/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

Nepasice(HK),cesta HC2A,HC2B,překl.,VPI

Název stavby u Stavebníka

R 179 – Cesta HC2A, HC2B v k.ú. Nepasice

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebně technickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:
- zajistit vyhotovení Projektu,

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky)

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu se s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:

- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky - viz kontakt Čl.8a věci technické této smlouvy,

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa

je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První etapa“) a bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa“) a považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí 225 997,00 Kč Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen Projekt“) na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační),

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně oznámí do 1 měsíce od získání pravomocného Územního rozhodnutí na překládku SEK Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

a) Fakturu č. 1 ve výši 79 897,00,- Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodloužení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodloužení. CETIN tímto bere na vědomí, že stavebník je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. CETIN souhlasí s tím, že v případě nedostatku

finančních prostředků na účtu stavebníka, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Stavebník se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, CETIN nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se stavebník dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: Miloš Moravec funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: RNDr. Marie Jančíková funkce : vedoucí Pobočky Hradec Králové
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx

ve věcech technických: Eva Pavlová funkce : referent
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx

Čl. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle Zákona. Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem. Stavebník se zavazuje doručit [SMLUVNÍ STRANA_CETIN] potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle Zákona vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN druhé smluvní straně.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :


1. Cenový a technický návrh
2. Specifikace nákladů překládky
3. Specifikace První etapy překládky
4. Pověření CETIN
5. Pověření nebo PM stavebník


V Praze dne 26.9.2017

V Hradci Králové dne 3.10.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ing. Miroslav Kot
Supervizor, Výstavba přístupové sítě

Státní pozemkový úřad
RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové

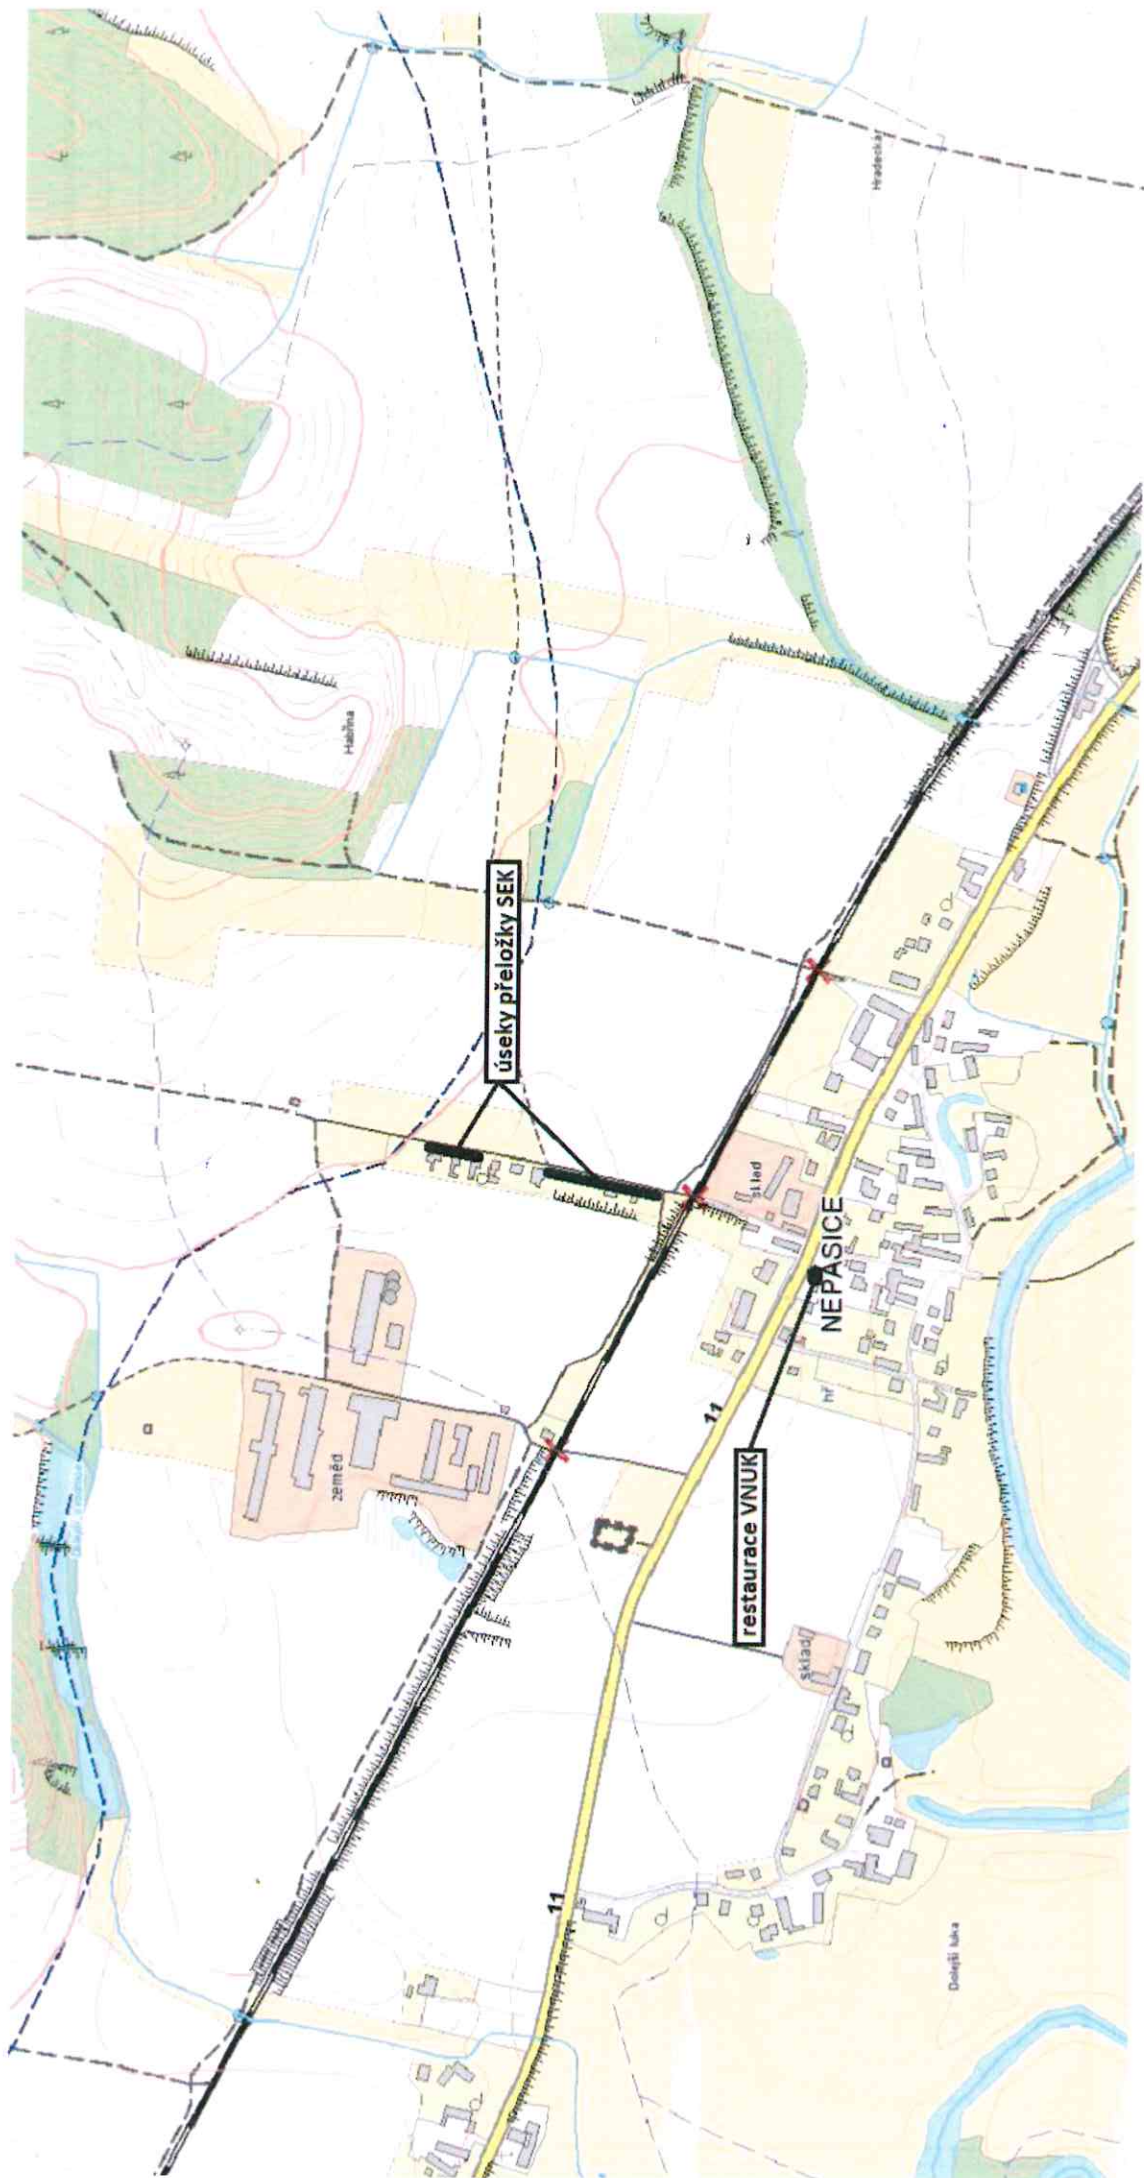

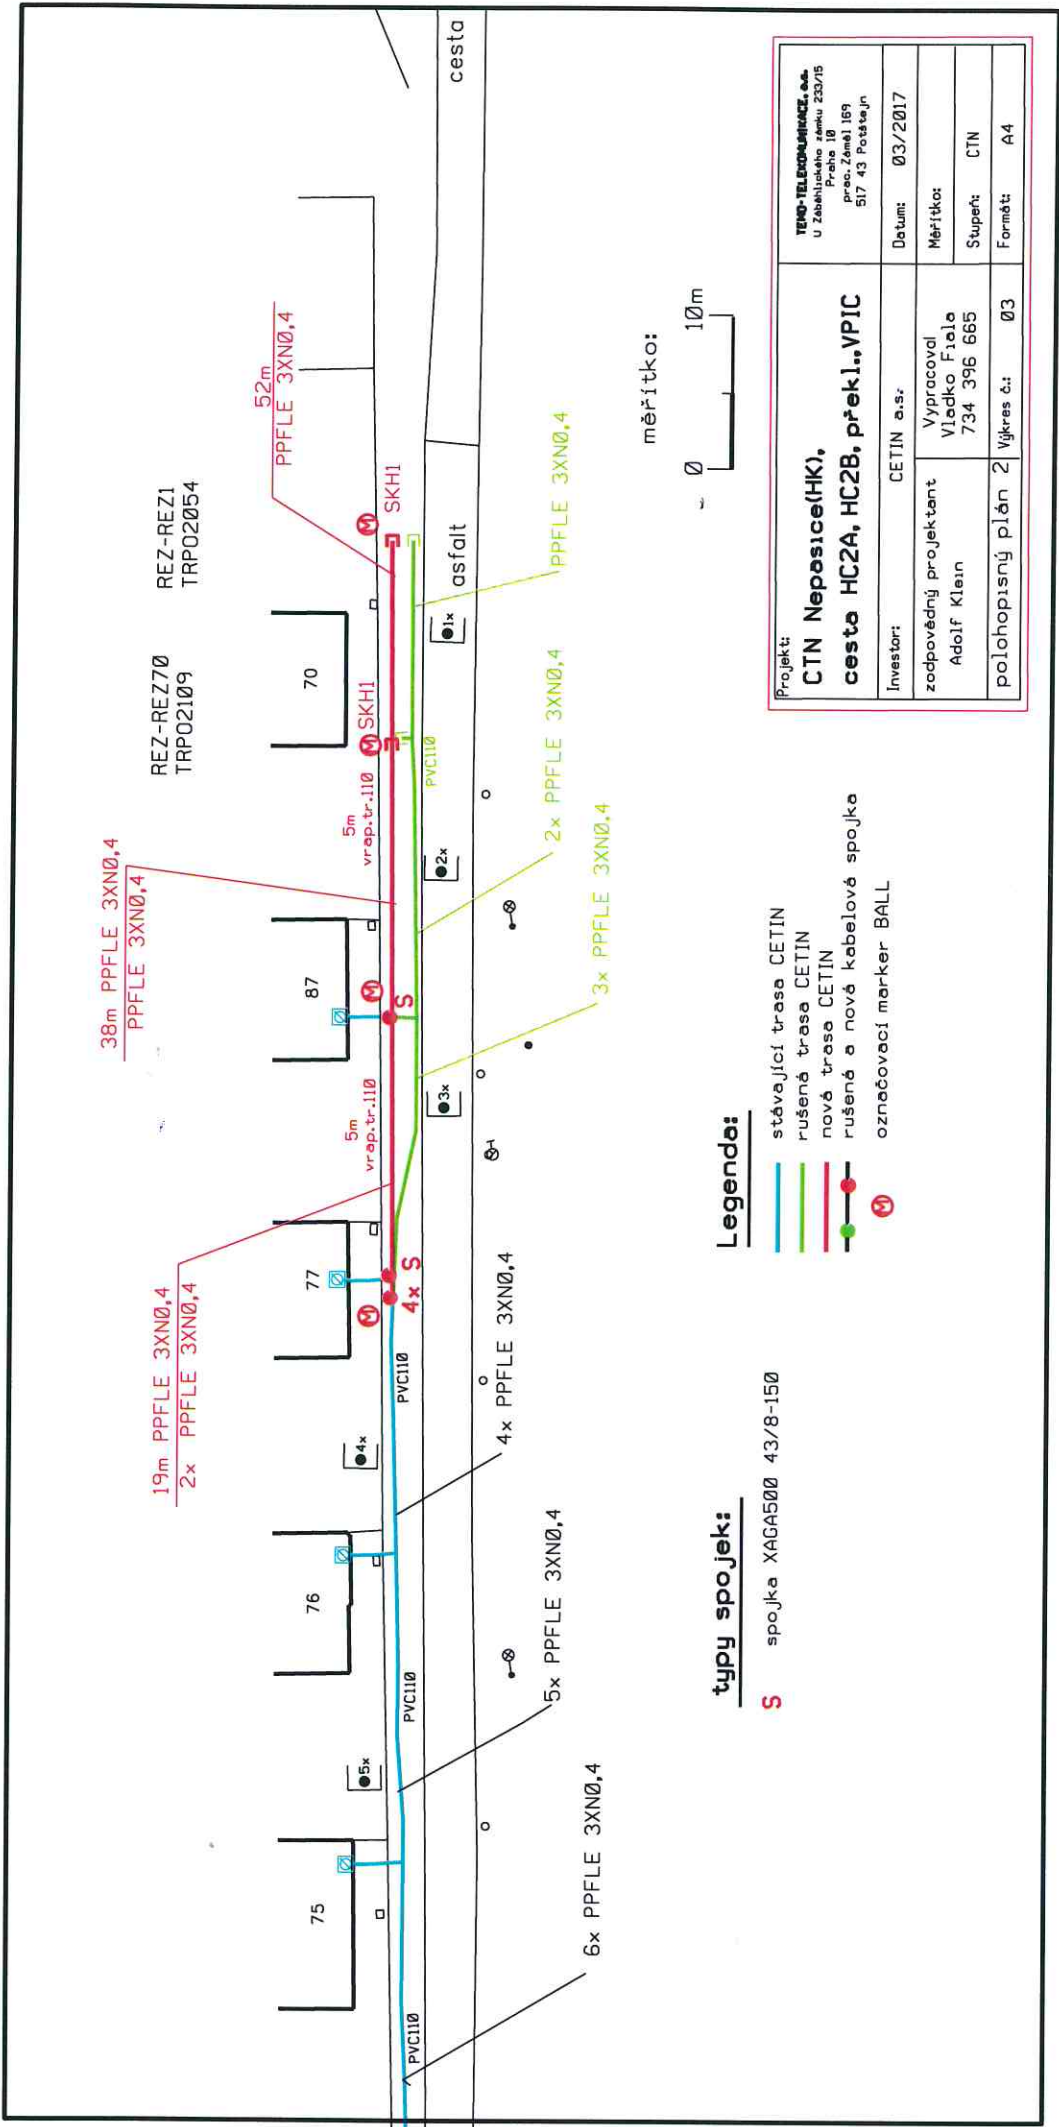

38m PPFLE 3XN0,4
PPFLE 3XN0,4

19m PPFLE 3XN0,4
2x PPFLE 3XN0,4

REZ-REZ70
TRP02109

REZ-REZ1
TRP02054



měřitko:

typy spojky:

S spojka XAGAS00 43/8-150

Legenda:

- stávající trasa CETIN
- rušená trasa CETIN
- nová trasa CETIN
- rušená a nová kabelová spojka
- Ⓜ označovací marker BALL

Projekt:	CTN Neposice(HK), cesta HC2A, HC2B, překl.,VPIC		
Investor:	CETIN a.s.	Datum:	03/2017
zodpovědný projektant:	Vypracoval Vlček Fiala	Měřitko:	
	Adolf Klein	Stupně:	CTN
polohopisný plán 2	Výkres č.: 03	Formát:	A4

TRP-TELEKOMUNIKACE, a.s.
U Záběhlického želez. 233/15
Praha 10
Prac.zámeč.189
517 43 Počástejn

Název stavby: CTN Nepasice(HK), cesta HC2A, HC2B, překl., VPIC

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Vladko Fiala

KPO:

HK

HOST:

HK

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.188	KMP:	5.234	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.001	KMMK:	0.667	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	52 642 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	55 060 Kč
MONTÁŽ	46 031 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 403 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 835 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	7 877 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	27 299 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	20 000 Kč

Celkové náklady: 225 997 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
	958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě 0,101-0,400km v zóně I	20174.80 JV	20 175 Kč
	954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění st 28024.00 JV je třeba získání Rozhodnutí drážního úřadu		28 024 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
	954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	41.00 m	608 Kč
	952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	187.00 m	51 704 Kč
	955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	1.00 m	1 077 Kč
	955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	188.00 m	1 671 Kč
MONTÁŽ				
	955093 S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	741 Kč
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřl 12.00 ks		1 540 Kč
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby- další čtyřl 36.00 ks		1 067 Kč
	954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	63.00 ks	1 244 Kč
	955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	15.00 ks	370 Kč
	955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	851 Kč
	955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	18.00 ks	16 885 Kč

Název stavby:	CTN Nepasice(HK), cesta HC2A, HC2B, překl., VPIC			
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	667.00 m	11 199 Kč	
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	901 Kč	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	37.00 ks	731 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks	2 864 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	37.00 ks	512 Kč	
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks	1 185 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	88.00 m	1 206 Kč	
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	4 197 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	88.00 m	1 022 Kč	
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	4 197 Kč	
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	4 616 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 188m x20,-Kč/bm + 500,- Kč za SIS1QT	4260.00 JV	4 260 Kč	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 000 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z	1.00 ks	1 617 Kč	
POPLATKY				
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. správní poplatek za 20000,-Kč za vydání územního rozhodnutí	20000.00 JV	20 000 Kč	
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	145.00 ks	2 506 Kč
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	1.00 kg	48 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	2.00 m	7 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	187.00 m	797 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	72.00 m	1 804 Kč
300107 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	8.00 m	283 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	579.00 m	7 527 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	8.00 m	131 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	312.00 ks	434 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	1 895 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	2.00 ks	844 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	149 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	16.00 ks	6 699 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ	2.00 ks	1 049 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	2.00 ks	67 Kč
309974 S		Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	44 Kč
301518 S		Trubička smršť. SD 127F 12,7/6,4mm černá	0.60 m	63 Kč
301786 S		Trubička smršť. SD 32F 3,2/1,6 mm	1.40 m	64 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	1.00 ks	495 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	38.00 m	1 497 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	10.00 ks	898 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	16.00 ks	0 Kč

Název stavby: CTN Nepasice(HK), cesta HC2A, HC2B, překl., VPIC _ etapa 1

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vladko Fiala
KPO: HK
HOST: HK
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.188	KMP:	5.234	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.001	KMMK:	0.667	půdnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	52 642 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 403 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	20 000 Kč

Celkové náklady: 79 897 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV	20 175 Kč
		0,101-0,400km v zóně I		
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	28024.00 JV	28 024 Kč
		je třeba získání Rozhodnutí drážního úřadu		
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	88.00 m	1 206 Kč
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	20000.00 JV	20 000 Kč
		správní poplatek za 20000,-Kč za vydání územního rozhodnutí		

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana ,

Ing. Miroslava Kota

os. č. 3672, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01, r.č. 600222/2072,

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.


V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.


Toto pověření je platné do 10. 6. 2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 8. 6. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Martin Vlček
předseda představenstva



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/992,1036 /2017

Ověřuji, že:

Martin Vlček, nar. 2.10.1977-----

bydlištěm, Korunní 962/85, Praha 3-----

Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm, K Potokům 205, Řitka-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

V Praze dne 8.6. 2017-----



Marcela Šrámková

Marcela Šrámková
notářská ujednání
pověřená Mgr. Radimem Neubaerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Křižovatka 6

á telekomunikační infrastruktura a.s.
sídlo: 2681/6
13 00 Praha 3
DIČ: CZ04084053

240
